



FEASR

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE DEL VENETO



GAL Prealpi e Dolomiti

**PREalpi e Dolomiti per l'Innovazione e il Rilancio
dell'Economia PRE.D.I.R.E**

**I RISULTATI DELLA
PROGRAMMAZIONE LOCALE 2007-2013
GAL PREALPI E DOLOMITI**

A cura di Valentina Colleselli per conto del GAL Prealpi e Dolomiti

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE	5
2.1	GESTIONE FINANZIARIA DEL PSL, STANZIAMENTI E VARIAZIONI	5
2.2	MAPPATURA DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI ED IMPORTI STANZIATI PER SINGOLA MISURA	10
3.	ANALISI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI ATTRAVERSO IL PSL	16
3.1	MISURA 121 E 123	16
3.2	MISURA 311	20
3.3	MISURA 312	24
3.4	MISURA 227	27
3.5	MISURA 331	30
3.6	MISURA 313	32
3.7	MISURA 321	38
3.8	MISURA 323	41
4.	CONCLUSIONI	47
4.1	L'ANALISI DEGLI INDICATORI PROPOSTI	47
4.2	RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO DEGLI OBIETTIVI TARGET IN BASE AGLI INDICATORI DATI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE	47

1. PREMESSA

Il presente documento vuole essere uno strumento atto a fornire agli enti di controllo, agli interlocutori del territorio ed alla cittadinanza in generale, prime informazioni relative agli interventi finanziati con i fondi Leader Asse IV 2007-2013 nell'ambito del Piano di Sviluppo Locale **PRE.D.I.R.E.** implementato da parte del GAL Prealpi e Dolomiti. Si tratta quindi di un'attività che mira a verificare in termini quantitativi, e qualitativi, il raggiungimento degli obiettivi in relazione ai risultati attesi, ai fabbisogni espressi dal territorio, e la coerenza degli interventi rispetto alle dinamiche di sviluppo locali cogliendo quale sia stata la funzione del Gruppo di Azione Locale Prealpi e Dolomiti nello sviluppo di strategie locali.

L'obiettivo del lavoro condotto dal GAL Prealpi e Dolomiti è quello di avere una precisa idea dell'esito della programmazione in corso in termini di risposta dal territorio, reale interesse, problemi riscontrati, ma anche cogliere quali tipologie di azioni sono state attivate sul territorio.

Al fine di svolgere l'indagine sono stati quindi presi in esame gli *indicatori di output* e gli *indicatori di risultato* presenti nel documento PRE.D.I.R.E, e sono stati inoltre analizzati ulteriori elementi di valutazione quali: la tipologia di beneficiari, la tipologia di interventi, le aree di contesto dove gli interventi sono stati realizzati grazie ad una puntuale verifica della documentazione relativa ai progetti finanziati svolta presso gli uffici provinciali dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) ed una attiva collaborazione del personale di AVEPA della sede periferica di Belluno.

L'analisi tiene conto delle competenze ed i ruoli assunti da parte dei Gruppi di Azione Locale, l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore nella gestione Leader e rappresenta pertanto una prima rilevazione sul territorio di alcuni dati che andranno poi condivisi anche con l'Autorità di Gestione preposta al monitoraggio ed alla valutazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Al fine quindi di chiarire quali siano i valori di riferimento considerati e di strutturare la presente indagine, si sintetizza qui di seguito quali sono gli elementi presi in esame e la loro funzione secondo l'obiettivo dato e le definizioni sopra indicate per ogni singolo indicatore:

Valutazione di output: per ogni Azione prevista nell'ambito del Piano di Sviluppo Locale sono stati innanzitutto considerati i valori proposti dal documento programmatico stesso sotto la voce *Indicatori di output/realizzazione*. Tali indicatori comprendono sufficienti elementi quantitativi riferiti al target finanziario in termini di impegno e spesa dei fondi disponibili nonché indicatori numerici riferiti alle attività svolte utili a definire una prima mappatura degli interventi effettuati, per misura, area geografica ed entità del contributo.

Valutazione di risultato: anche in questo caso i primi elementi di valutazione sono stati determinati dagli indicatori previsti nell'ambito del Piano di Sviluppo Locale e sono riferibili ai c.d. *Indicatori di risultato*. Tuttavia per ogni singola azione i valori proposti sono stati analizzati tenendo conto dell'effettivo contenuto dell'intervento realizzato e quindi la reale e concreta connessione tra tale intervento ed il risultato prodotto.

I dati riportati nel presente documento sono aggiornati ad aprile 2015 e tengono conto del fatto che sono ad oggi ancora in essere alcuni interventi la cui istruttoria verrà completata da parte di AVEPA nelle prossime settimane.

Alcune considerazioni di contesto, connesse alla gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto, sono contenute nel presente documento e tengono conto degli elementi raccolti in relazione al contesto regionale, nonché delle valutazioni intermedie del Programma di Sviluppo Rurale Veneto 2007-2013 svolte da parte della Regione del Veneto.

L'attività di analisi svolta si è limitata a considerare parte degli elementi di monitoraggio e valutazione relativi all'esecuzione del Piano di Sviluppo Locale, concentrandosi sui seguenti elementi:

- Attuazione della strategia di sviluppo locale, esecuzione finanziaria e obiettivi di spesa: nell'analisi complessiva dello stato di attuazione del programma l'analisi ha riguardato l'attuazione della Misura 410 e la Misura 421 (cooperazione). In particolare è stata svolta una analisi complessiva degli interventi ammessi al contributo ed importi stanziati per singola Misura; è stata fatta una valutazione del rapporto tra finanziamenti stanziati e contributi effettivamente erogati (liquidato su concesso), e delle criticità riscontrate e rinunce ricevute (target raggiunto); sono state inoltre considerate le tipologie di intervento finanziate, la natura pubblica o privata dei beneficiari, il settore di intervento; infine sono state considerate le variazioni intervenute nel corso dell'implementazione del programma e le modalità di attuazione (a bando; a regia) proposte.
- Valutazione puntuale degli interventi ammessi al contributo, attuazione delle singole Azioni: nel corso dell'analisi svolta è stata effettuata una mappatura puntuale dei progetti finanziati attraverso la compilazione di schede informative standard per ogni intervento; è stato quindi verificato il raggiungimento degli indicatori di output e risultato per ogni azione finanziata e, dove possibile le prospettive di impatto degli interventi nonché la coerenza e complementarità con altri fondi attuati sul medesimo territorio.
- Raggiungimento complessivo degli obiettivi target in base agli indicatori dati e valutazioni conclusive.

2. ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

Il Piano di Sviluppo Locale del GAL Prealpi e Dolomiti per il periodo 2007-2013 è denominato Prealpi e Dolomiti per l'Innovazione e il Rilancio dell'Economia – PRE.D.I.R.E. Tale documento è parte integrante del Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto per il medesimo periodo di programmazione ed in particolare è finanziato nel quadro dell'approccio Leader Asse IV.

L'obiettivo generale individuato dal PSL del GAL Prealpi e Dolomiti per il periodo 2007-2013, è stato quello di favorire lo sviluppo e la crescita sostenibili nell'area, mobilitando le potenzialità endogene locali tramite, da un lato, il miglioramento della competitività, la diversificazione e l'innovazione del sistema produttivo e, dall'altro, l'aumento della qualità della vita e dell'attrattività turistica del sistema territoriale.

Le linee strategiche di intervento invece si riferiscono a due temi chiave individuati grazie ad una approfondita analisi di contesto del territorio di riferimento da parte del GAL Prealpi e Dolomiti ed in particolare:

- Il tema della **Competitività** (Linea strategica di intervento n. 1: Azioni a favore delle competitività economica del territorio) quale fattore di: a) crescita economica (competitività economica) attraverso misure atte a favorire il tessuto imprenditoriale locale con particolare attenzione alle microimprese, le filiere produttive, le aree marginali; b) valorizzazione territoriale (competitività territoriale) con iniziative legate alla promozione della filiera turistica e sostegno al patrimonio, naturale storico e culturale del territorio, incluso il settore enogastronomico; c) crescita del capitale umano mediante interventi atti a favorire l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e creare nuove opportunità di lavoro.
- Il tema della **Qualità del vita** (Linea strategica di intervento n. 2: Azioni per la qualificazione del sistema insediativo e la valorizzazione del capitale sociale) invece, coerentemente con quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Regionale del Veneto, ha puntato al miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione: gli asse naturali e culturali diventano quindi fattore di sviluppo in funzione della vivibilità dei territori per la popolazione locale, e la loro residenzialità.

2.1. Gestione finanziaria del PSL, stanziamenti e variazioni.

Dal punto di vista finanziario, all'inizio del periodo di programmazione, la ripartizione economica del budget rispetto alle linee strategiche sopra descritte, nonché in relazione alle tipologie di Azioni finanziate, dimostrava una particolare attenzione da parte del GAL Prealpi e Dolomiti nei confronti del primo dei due elementi, ovvero il tema della Competitività, con azioni che prevedevano quindi come target soprattutto il settore privato e l'impresa (micro) quale fattore trainante dell'economia locale.

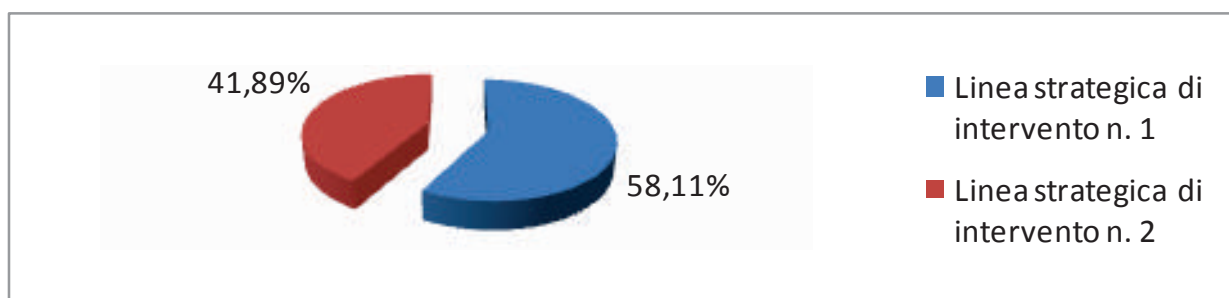


Tabella n. 1 – Elaborazione dati PRE.D.I.R.E 2007-2013 - GAL Prealpi e Dolomiti

Di seguito si riporta il quadro delle Azioni finanziate in relazione a tema di riferimento e l'impegno finanziario iniziale assunto nell'ambito della Misura 410: Attuazione di strategie di Sviluppo locali.

Linea strategica di intervento n. 1: Azioni a favore delle competitività economica del territorio		
Misure/Azioni del PSL	€ stanziamento contribuito	%
311. Azione 1. Creazione e consolidamento fatt. puri.	180.000,00	2,36%
311. Azione 2. Sviluppo ospitalità agrituristica	800.000,00	10,47%
312. Microimprese turismo, commercio, servizi	1.000.000,00	13,09%
313. Azione 1. Itinerari turistici	800.000,00	10,47%
313. Azione 2. Strutture di accoglienza turistica	500.000,00	6,55%
313. Azione 3. Promozione e commercializzazione	200.000,00	2,62%
313. Azione 4 Informazione turistica	298.194,00	3,90%
331. Azione 1. Formazione e informazione collettiva	100.000,00	1,31%
121. Ammodernamento aziende agricole	160.000,00	2,09%
123. Accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli	300.000,00	3,93%
111. Formazione professionale ed informazione	100.000,00	1,31%
Linea strategica di intervento n. 2: Azioni per la qualificazione del sistema insediativo e la valorizzazione del capitale sociale.		
Misure/Azioni del PSL	€ stanziamento contribuito	%
321. Azione 1. Servizi sociali	200.000,000	2,62%
321. Azione 3. Biomasse per produzione energia	400.000,00	5,24%
323/a. Azione 1. Studi sul patrimonio rurale	100.000,00	1,31%
323/a Azione 2. Patrimonio storico-architettonico	1.000.000,00	13,09%
323/a Azione 3. Paesaggio rurale	600.000,00	7,86%
323/a Azione 4. Valorizzazione culturale aree rurali	700.000,00	9,16%
227. Investimenti forestali non produttivi	200.000,00	2,62%
TOTALE STANZIAMENTO CONTRIBUTO	7.638.194,00	100%

Tabella n. 2 – Dati PRE.D.I.R.E 2007-2013- GAL Prealpi e Dolomiti

Dal punto di vista del quadro degli interventi proposto nell'ambito del PSL PRE.D.I.R.E. è opportuno fare alcune considerazioni sulle modalità attuative e variazioni avvenute in corso d'opera per meglio comprendere le modalità di attuazione e gli impegni stanziati in relazione alle Azioni finanziate e relativi risultati.

Il GAL Prealpi e Dolomiti ha avuto il ruolo di valutare i criteri di selezione, gestire i bandi e determinare le graduatorie di assegnazione dei contributi previsti da ogni Azione attivata. Nel corso dell'implementazione del programma, in base alle domande pervenute, le rinunce di alcuni beneficiari e la valutazione delle criticità e fabbisogno riscontrati, sono state effettuate alcuni variazioni al programma volte a recuperare le economie derivanti dalla mancata attuazione di alcuni interventi e riallocare il relativo budget su diverse linee di intervento.

Tramite le variazioni eseguite e comunicate all'Autorità di Gestione, è stato possibile, pur mantenendo invariata la strategia descritta nel PSL, non solo garantire la copertura finanziaria di un maggior numero di interventi ma anche raggiungere un elevato target di spesa. Alla data di 31 marzo 2013 il GAL Prealpi e Dolomiti aveva raggiunto e superato infatti il proprio obiettivo di spesa (75% di spesa impegnata calcolata su importo totale spesa pubblica) previsto grazie all'efficiente gestione dei bandi. Di conseguenza esso ha beneficiato di una primalità, ossia uno stanziamento aggiuntivo rispetto allo stanziamento iniziale previsto, definito overbooking, di € 382.000,00 (pari a circa il 5% del budget iniziale), che ha permesso di erogare una somma complessiva di contributi pubblici pari ad € 8.020.194,00.

Ulteriori variazioni intervenute nel corso dell'implementazione del programma hanno riguardato i seguenti aspetti:

Quadro degli interventi – nell'ambito della 6° variazione, il quadro degli interventi è stato modificato: riscontrata la parziale sovrapposizione con gli interventi attivati tramite l'Azione 331, l'Azione 111 è stata annullata con conseguente riallocazione finanziaria del budget di competenza sull'azione 121 (totale € 100.000,00).

Operazioni a regia - nell'ambito della 1° variazione presentata un data 26 novembre 2009 e della 3° variazione presentata in data 28 luglio 2011 si è ritenuto opportuno richiedere la conversione delle modalità attuative da bando a regia di tutta la Misura 313 (Azione 1,2,3,4) e della Misura 323 Azione 1 e Azione 4 in quanto in ragione della natura degli investimenti previsti dalla misura nonché dei potenziali soggetti beneficiari (enti pubblici) la modalità attuativa a regia risultava più funzionale perché più rispondente ad una chiara valenza pubblica degli interventi.

Piano generale degli interventi di cooperazione – nell'ambito della 3° variazione, presentata in data 28 luglio 2011, è stato modificato il quadro degli interventi relativi alla Misura 421 per quanto riguarda i progetti di cooperazione in quanto due progetti su quattro previsti e più precisamente il progetto n°1 ed il progetto n°2 sono stati annullati con conseguente riallocazione finanziaria del budget di competenza e revisione delle Misure attuabili.

Programma Finanziario – in seguito agli interventi e modifiche sopra esposte ed in seguito alle richieste di variazione N°3,4,5,6 presentate da parte del GAL Prealpi e Dolomiti e approvate da parte della Regione del Veneto.

Il quadro definitivo degli stanziamenti finanziari per ogni Azione è il seguente:

Misura 410: Attuazione di strategie di Sviluppo locali

Linea strategica di intervento n. 1 Azioni a favore delle competitività economica del territorio		
Misure/Azioni del PSL	Stanziamento iniziale	Stanziamento definitivo
311. Azione 1. Creazione e consolidamento fatt. puri.	180.000,00	100.000,00
311. Azione 2. Sviluppo ospitalità agrituristica	800.000,00	772.935,10
312. Microimprese turismo, commercio, servizi	1.000.000,00	1.152.188,36
313. Azione 1. Itinerari turistici	800.000,00	740.541,90
313. Azione 2. Strutture di accoglienza turistica	500.000,00	450.824,79
313. Azione 3. Promozione e commercializzazione	200.000,00	199.800,00
313. Azione 4 Informazione turistica	298.194,00	283.633,24
331. Azione 1. Formazione e informazione collettiva	100.000,00	98.928,27
121. Ammodernamento aziende agricole	160.000,00	396.320,49
123. Accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli	300.000,00	177.607,78
111. Formazione professionale ed informazione	100.000,00	0,00
Linea strategica di intervento n. 2 Azioni per la qualificazione del sistema insediativo e la valorizzazione del capitale sociale.		
Misure/Azioni del PSL	Stanziamento iniziale	Stanziamento definitivo
321. Azione 1. Servizi sociali	200.000,00	200.000,00
321. Azione 3. Biomasse per produzione energia	400.000,00	115.816,20
323/a. Azione 1. Studi sul patrimonio rurale	100.000,00	61.312,87
323/a Azione 2. Patrimonio storico-architettonico	1.000.000,00	1.656.364,50
323/a Azione 3. Paesaggio rurale	600.000,00	600.635,16
323/a Azione 4. Valorizzazione culturale aree rurali	700.000,00	779.438,35
227. Investimenti forestali non produttivi	200.000,00	233.846,99
TOTALE STANZIAMENTO CONTRIBUTO	7.638.194,00	8.020.194,00

Tabella n. 3 – Elaborazione dati PRE.D.I.R.E 2007-2013, GAL Prealpi e Dolomiti

Nel corso dell'implementazione del programma è sorta una sempre più evidente attenzione alle tematiche legate alla valorizzazione del territorio dovuta all'alto numero di richieste pervenute nell'ambito del primo bando finanziato ritenute eleggibili ma non ammesse al finanziamento per mancanza di stanziamento iniziale fondi sufficiente. Di conseguenza le risorse aggiuntive ricevute come premialità per l'overbooking sono state per la maggior parte allocate a beneficio della Misura 323. In particolare l'Azione 323/a - 2. Patrimonio storico-architettonico ha beneficiato di un contributo aggiuntivo pari al (65,64%) con conseguente apertura di un nuovo bando nel corso del 2013.¹

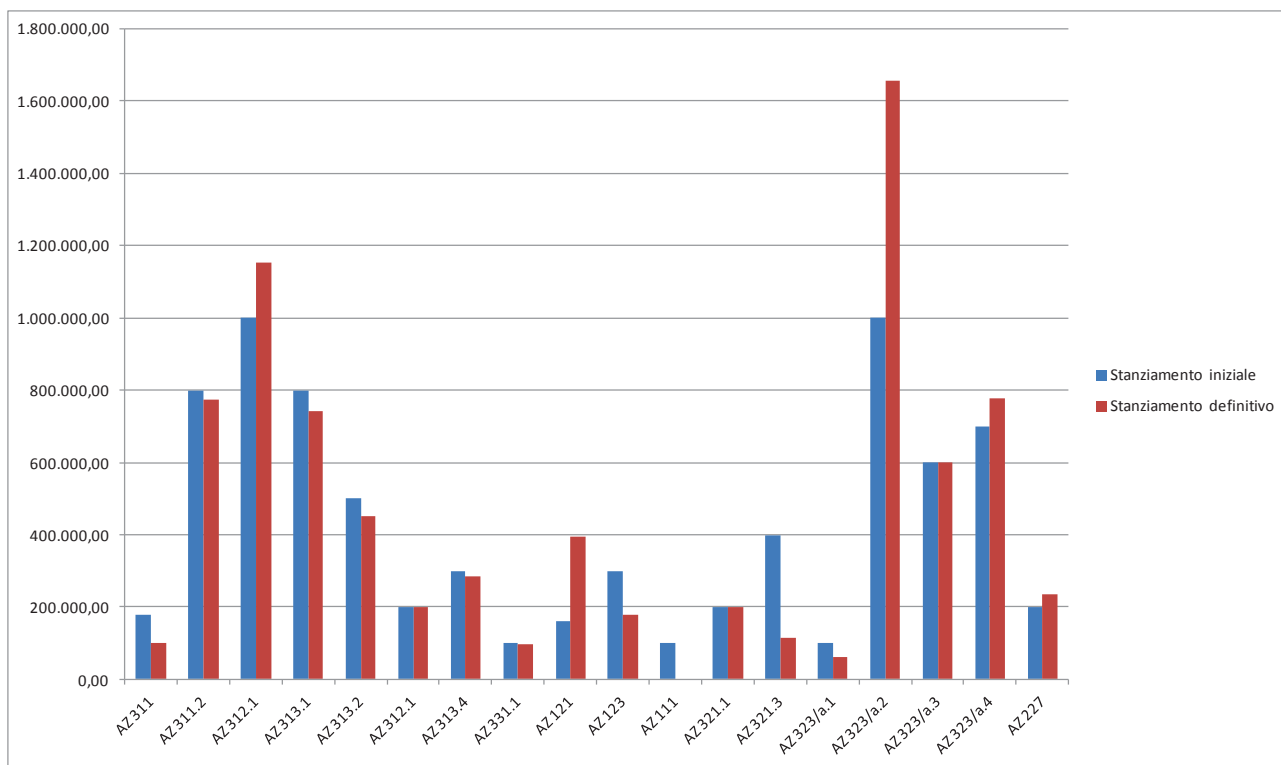


Tabella n. 4 – Elaborazione dati PRE.D.I.R.E 2007-2013 GAL Prealpi e Dolomiti

Lo stanziamento definitivo ha quindi aumentato le risorse collegate alla seconda linea di intervento del PSL PREDIRE: da un iniziale stanziamento pari al 41,89% del budget complessivo su questo tema si è quindi passati ad un 45,48%.

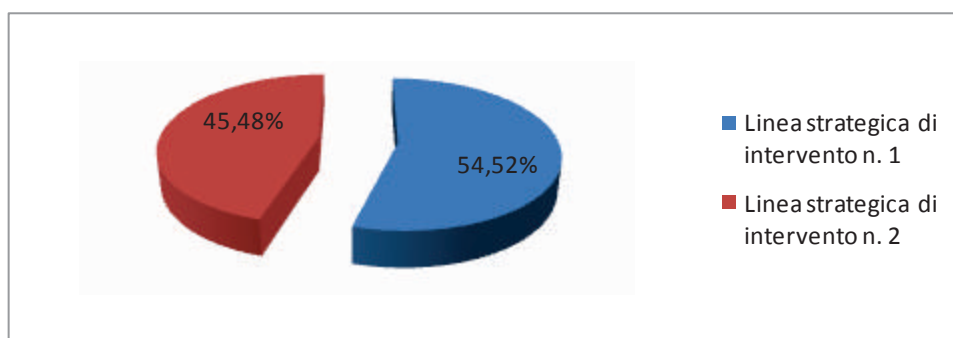


Tabella n. 5 – Elaborazione dati PRE.D.I.R.E 2007-2013 GAL Prealpi e Dolomiti

¹ Dato riferito a graduatoria pubblicata su sito del GAL al seguente link: <http://www.gal2.it/bandi-e-finanziamenti/bandi-pubblici>: a fronte di una richiesta di contributi pari ad € 2.697.480,58 sono stati infatti impegnati € 1.050.271,48.

2.2 Mappatura degli interventi effettuati ed importi stanziati per singola Misura.

L'analisi svolta e riportata nel presente documento fa riferimento alla data del 10 aprile 2015 e tiene conto del fatto che alcune Azioni non sono state ancora concluse: a novembre 2014 è stata infatti concessa una ulteriore proroga da parte della Regione del Veneto che ha permesso ad alcuni beneficiari di richiedere il posticipo della chiusura degli interventi ai primi mesi del 2015 (data limite 30/4/2015). I dati analizzati tuttavia permettono di restituire un quadro complessivo completo e realistico delle attività svolte e degli interventi finanziati. Le eventuali variazioni a saldo in concomitanza con la chiusura degli ultimi interventi saranno verificabili attraverso la mappa interattiva degli interventi presente sulla pagine web del sito del GAL Prealpi e Dolomiti (www.gal2.it) da cui sono estratte le immagini inserite nel presente documento.

L'attuale stato dell'arte nell'attuazione del programma permette quindi una valutazione precisa degli interventi finanziati e conclusi per tipologia, beneficiario, area geografica, mentre i dati definitivi relativi a stanziamenti e contributi concessi saranno disponibili solamente in seguito ad istruttoria condotta da AVEPA degli interventi in corso e la verifica di eventuali rinunce o variazioni.

In base quindi ai dati raccolti, le informazioni generali relative al quadro degli interventi finanziati sono le seguenti:

- Attraverso la Misura 410 risultano finanziati in tutto 170 interventi in area GAL Prealpi e Dolomiti per un valore totale di investimenti di € 14.564.632,50;
- Attraverso la Misura 421 ed i progetti di cooperazione attivati (Progetto Mulini e Progetto Piave-Live) sono stati invece finanziati 9 interventi per un valore totale di investimenti di €1.030.951,00.
- Il contributo effettivo totale concesso (al netto delle economie definite in fase di rendicontazione finale degli interventi), tenendo conto quindi sia della Misura 410 che della Misura 421, al 10 aprile 2015, risulta pari ad € 8.801.917,83 (ovvero € 7.861.677,13 sulla Misura 410 e la cifra rimanente pari ad € 940.240,70 a favore dei beneficiari degli interventi attivati tramite la Misura 421).

Le Misure attivate tramite il PSL da parte del GAL sono principalmente contenute nell'Asse 3 del PSR Veneto poiché l'obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e la diversificazione economica rappresentano gli elementi principali di azione per quanto riguarda l'approccio LEADER e la strategia del documento PRE.D.I.R.E. Le Misure attivate nell'ambito dell'Asse 1 e 2 sono quindi integrative e complementari rispetto a questo macro obiettivo

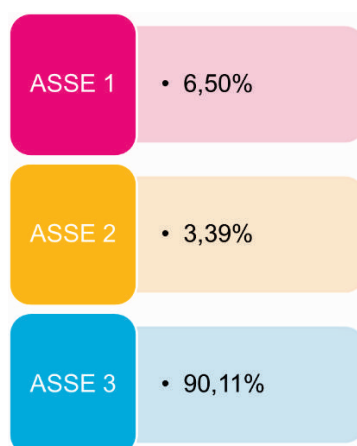


Tabella n. 6 – Percentuale contributo assegnato per ASSE di intervento rispetto al totale.
Elaborazione dati PRE.D.I.R.E 2007-2013 GAL Prealpi e Dolomiti

Gli interventi hanno riguardato 114 beneficiari privati e 65 pubblici

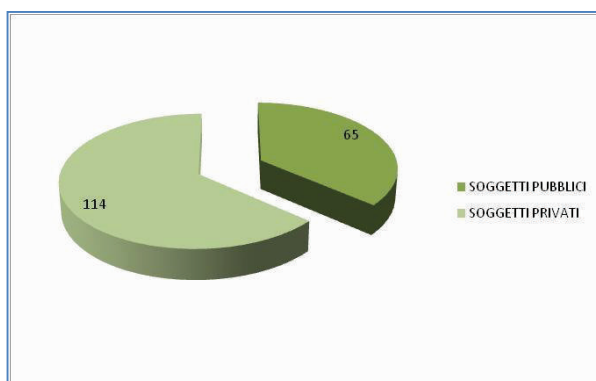


Tabella n. 7 – Elaborazione dati PRE.D.I.R.E 2007-2013 GAL Prealpi e Dolomiti

L'analisi dei beneficiari dimostra che nonostante il diverso numero di interventi finanziati per il pubblico ed il privato il contributo concesso è sostanzialmente equilibrato rispetto alle due categorie. Il contributo concesso ai privati ha attivato un più alto volume di investimenti aggiuntivi (rispetto al contributo dato) poiché nel settore pubblico soprattutto nell'ambito degli ultimi interventi ammessi, il contributo corrispondeva al 100% del valore degli investimenti.

Beneficiari pubblici	Beneficiari privati
Numero interventi: 65 Spesa ammessa: € 6.209.273,95 Contributo concesso: € 4.734.146,83	Numero interventi: 114 Spesa ammessa: € 9.386.309,55 Contributo concesso: € 4.067.771,00

Tabella n. 8 – Elaborazione dati PRE.D.I.R.E 2007-2013 GAL Prealpi e Dolomiti

In base ai dati disponibili all'interno della Banca Dati del PSR Veneto - Portale Regionale Piave – al 10/04/2015, il GAL Prealpi e Dolomiti risulta essere particolarmente efficace per quanto riguarda la percentuale di contributo liquidato rispetto all'impegnato.

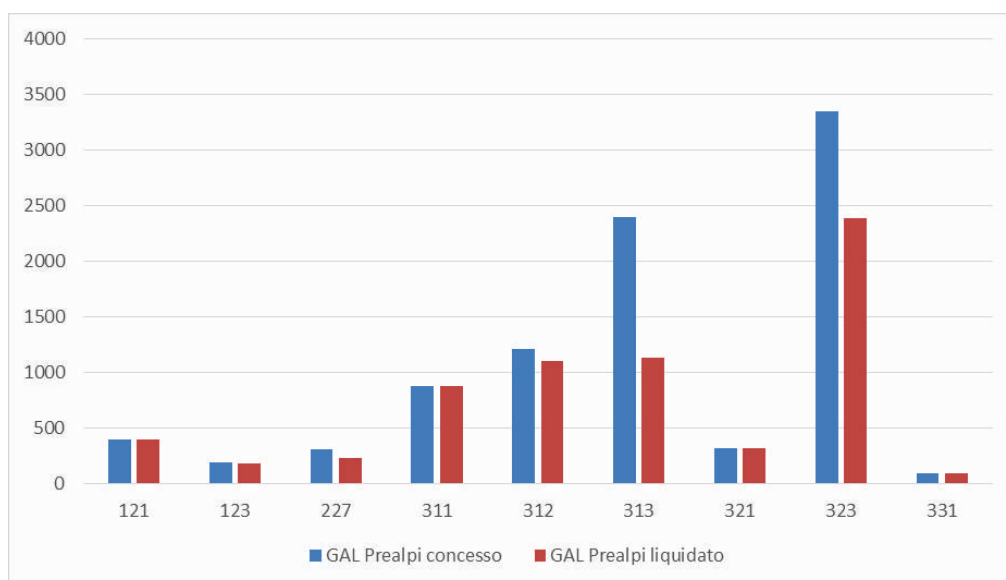


Tabella n. 9 - Dati Portale Piave – Banca Dati PSR - aggiornati ad aprile 2015

Nella tabella di raffronto (Tabella n.10) su capacità di spesa dei GAL Veneti (elaborazione fatta da parte del GAL Prealpi e Dolomiti su dati Portale Piave) la percentuale dell'importo liquidato su contributo concesso per quanto riguarda il GAL Prealpi e Dolomiti risulta essere alla data di aprile 2014 pari al 73,54%.²

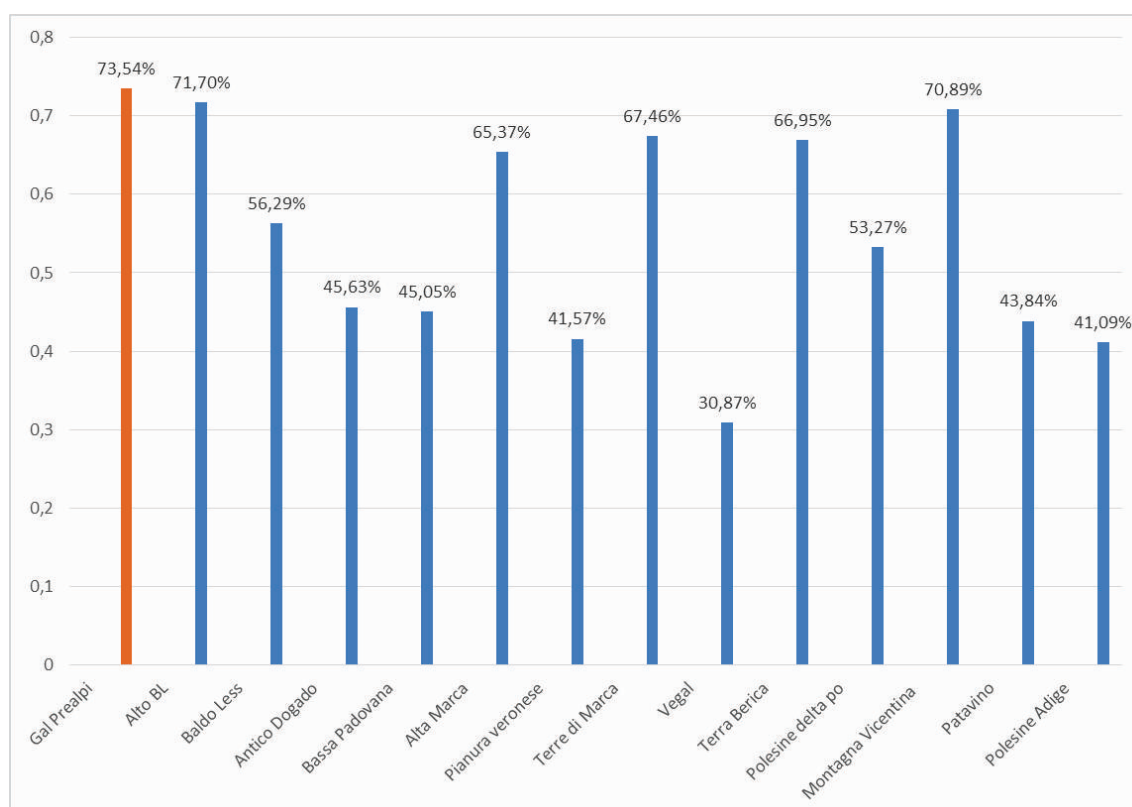


Tabella n. 10 - Dati Portale Piave – Banca Dati PSR - aggiornati ad aprile 2015

Per quanto riguarda i beneficiari privati è stata condotta una prima analisi per verificare quali tipologie di categorie economiche hanno beneficiato dei contributi concessi attraverso il GAL Prealpi e Dolomiti. In relazione quindi ai primi dati riferiti alle Azioni concluse con riferimento ai beneficiari privati tali settori possono essere così sintetizzati:

² La % di liquidato su concesso non tiene conto delle rinunce di alcuni beneficiari. Le somme impegnate ma non spese, sono state sempre re impegnate per finanziare interventi nell'ambito di altre Misure.

Categorie economiche beneficiari privati (% importo contributo concesso)

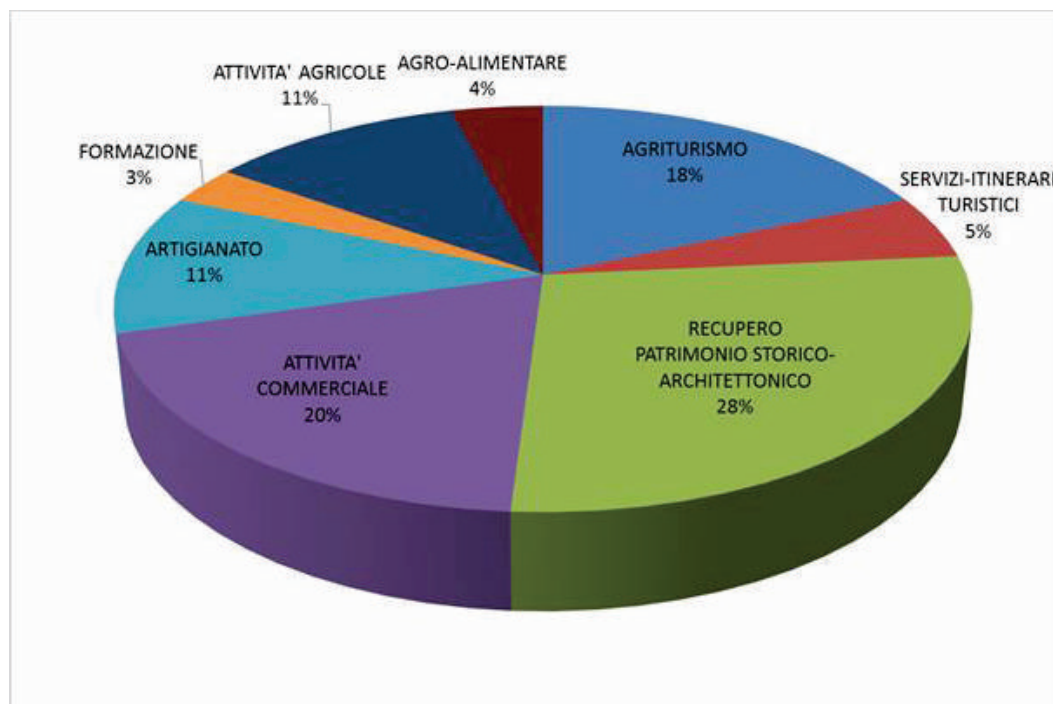


Tabella n. 11 - Elaborazione dati PRE.D.I.R.E 2007-2013 GAL Prealpi e Dolomiti

Per quanto riguarda invece il settore pubblico e sempre in relazione alle Azioni concluse, gli interventi si sono concentrati su alcuni ambiti specifici di seguito sintetizzati:

Tipologia di intervento beneficiari pubblici (% importo contributo concesso)

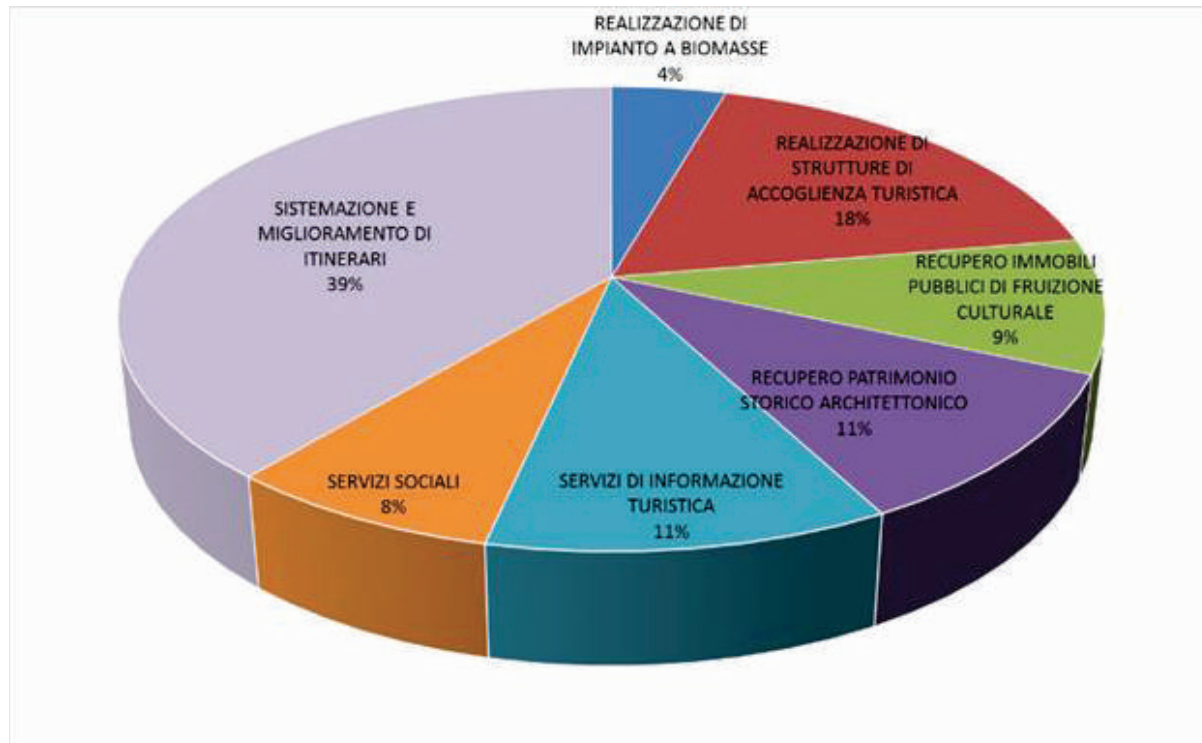


Tabella n. 12 - Elaborazione dati PRE.D.I.R.E 2007-2013 GAL Prealpi e Dolomiti

2.3 L'attuazione della Misura 421 – Progetti di Cooperazione.

Attraverso la Misura 421 il Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto per il periodo 2007-2013, ha permesso ai GAL, tramite l'approccio LEADER, di attivare progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale. L'obiettivo di tali tipologie di interventi è stato quello di creare un confronto e favorire gli scambi di esperienze tra gruppi di azione locale operanti in territori diversi.

Il GAL Prealpi e Dolomiti ha quindi deciso di proporre alcune iniziative di cooperazione nell'ambito della propria strategia di sviluppo locale. In particolare sono state attuate nel corso della programmazione in via di conclusione due iniziative progettuali:



Il progetto di cooperazione transnazionale 'Mulini'

Obiettivo: valorizzare a scopo turistico e didattico mulini e fucine delle diverse aree, con interventi di ricostruzione, restauro e riattivazione, nonché con azioni di promozione, marketing e messa in rete delle strutture dei territori.

GAL capofila: REGIONALMANAGEMENT WIPPTAL (Tirolo - Austria)

GAL partner: GAL PREALPI E DOLOMITI, GAL ALTO BELLUNESE

MISURE ATTIVATE DA PARTE DEL GAL PREALPI E DOLOMITI

- 313 "Incentivazione delle attività turistiche" Azione 1 "Itinerari e certificazione" – l'intervento ha previsto la qualificazione e realizzazione di un percorso intercomunale tra le Rogge di Veses di Santa Giustina e le Rogge del Cordevole di Sedico. Adeguamento e messa in sicurezza del percorso esistente, valorizzazione e fruizione, tabellazione e segnaletica. Beneficiario: Comune di Santa Giustina e Comune di Sedico.

- 323/a "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" Azione 4 "Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali" – Tramite l'azione è stato finanziato un intervento per il recupero del Molino di Rio Salere in località Pian di Vedoia. Beneficiario: Comunità Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi.

VALORE TOTALE INVESTIMENTI REALIZZATI: € 547.701,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO: € 457.490,70



Il progetto di cooperazione interterritoriale 'Piave-Live'

Obiettivo: promuovere congiuntamente e sinergicamente, mediante un approccio multidimensionale, le molteplici valenze degli ambiti fluviali del Piave e della Livenza (natura, ambiente, cultura, storia, identità), per sviluppare forme di turismo sostenibile nel territorio compreso tra i due fiumi e dunque sostenere la qualità della vita e la competitività dell'ambito rurale coinvolto.

GAL capofila: GAL PREALPI E DOLOMITI

GAL partner: GAL ALTA MARCA, GAL TERRE DI MARCA, GAL VENEZIA ORIENTALE (VeGAL)

MISURE ATTIVATE DA PARTE DEL GAL PREALPI E DOLOMITI

- 227 "Investimenti forestali non produttivi" Azione 1 "Miglioramenti paesaggistico-ambientali" – l'intervento ha riguardato la riqualificazione ed il miglioramento ambientale del lago di Busche ed ha previsto interventi di pulizia delle aree boschive la realizzazione percorsi, di un osservatorio di birdwatching, di una piattaforma pescatori con passerella, pannelli didattici. Beneficiario: Comune di Cesiomaggiore.

- 313 "Incentivazione delle attività turistiche" Azione 1 "Itinerari e certificazione" – l'intervento riguardava la realizzazione di un percorso ciclo pedonale intercomunale tra Trichiana e Mel. Estensione del percorso 14525 metri. Beneficiario: Comune di Trichiana e Comune di Mel. Sempre nell'ambito della medesima azione il progetto di cooperazione ha previsto la sistemazione di un itinerario tra Quero ed Alano di Piave: lungo il percorso circolare che partendo dalla riva sinistra del torrente Tergorzo Ponte Cagnin (frazione Schievenin) ritorna sulla riva destra del torrente (Campo di Alano di Piave). Beneficiario: Comune di Alano di Piave.

- 313 "Incentivazione delle attività turistiche" Azione 4 "Informazione" – tramite tale azione è stato possibile realizzare un progetto inter-provinciale con il coinvolgimento delle province di Belluno, Treviso e BIM Basso Piave. L'intervento ha permesso di svolgere attività di comunicazione-promozione condivise attraverso la realizzazione di una guida multimediale e-book in italiano ed inglese); il portale web piavein.org; supporti multimediali promozionali turistici (chiavette usb); un applicativo multimediale (APP) in italiano ed inglese (Piave in APP);

- 323/a "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" Azione 4 "Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali" - l'intervento la ristrutturazione impiantistica e l'adeguamento delle aree esterne al museo del Piave in Località Caorera, la realizzazione del parcheggio esterno, l'adeguamento dell'impianto elettrico e termico. Beneficiario: Comune di Vas.

VALORE TOTALE INVESTIMENTI REALIZZATI: € 482.750,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO: € 482.750,00

3. ANALISI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI ATTRAVERSO IL PSL

Per raccogliere i dati utili a sviluppare l'indagine sono state predisposte delle schede di valutazione per ogni Misura del programma, compilate in riferimento ad ogni intervento finanziato e contenenti informazioni relative alla tipologia di soggetti beneficiari finanziati, contenuto del progetto, principali indicatori di output e risultato raggiunti. I principali risultati ottenuti nell'implementazione di ogni singola Misura sono di seguito sintetizzati anche per il tramite di specifici *box* di dettaglio.

3.1 MISURA 121 E MISURA 123

MISURA 121 – Ammodernamento delle aziende agricole MISURA 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

Approccio generale: Come accennato sopra l'Asse 1 ha avuto, nell'ambito della strategia di sviluppo locale attivata dai GAL, carattere integrativo e complementare rispetto alle Misure previste dall'Asse 3 volte ad incentivare l'attività delle aziende agricole nelle aree rurali. La Misura 121 e la Misura 123 hanno avuto quindi l'obiettivo di sostenere, indirettamente, la diversificazione delle attività agricole e promuovere il ruolo multifunzionale dell'impresa nelle aree rurali. Entrambe le Misure hanno previsto il finanziamento di interventi mirati all'ammodernamento strutturale ed organizzativo delle imprese con particolare riferimento al sostegno alla produzione di qualità, le filiere corte e le micro filiere. In entrambi i casi l'innovazione di prodotto o di processo ha rappresentato un elemento imprescindibile di ammissibilità al finanziamento ed è stato poi valutato come indicatore di risultato nel presente documento.

Come riportato nella valutazione intermedia del PSR Veneto 2007-2013, la coerenza tra investimenti sovvenzionati e priorità regionali è stata raggiunta applicando alla selezione delle domande di aiuto i criteri di priorità, finalizzati anche a favorire gli investimenti diretti a ridurre la pressione dell'attività agricola sull'ambiente. Le priorità settoriali sono state rispettate ugualmente nell'ambito dell'approccio Leader, dove gli investimenti finanziati, seppure più contenuti, sono stati finalizzati prevalentemente alla riduzione dei costi, alla trasformazione e al miglioramento della qualità dei prodotti.

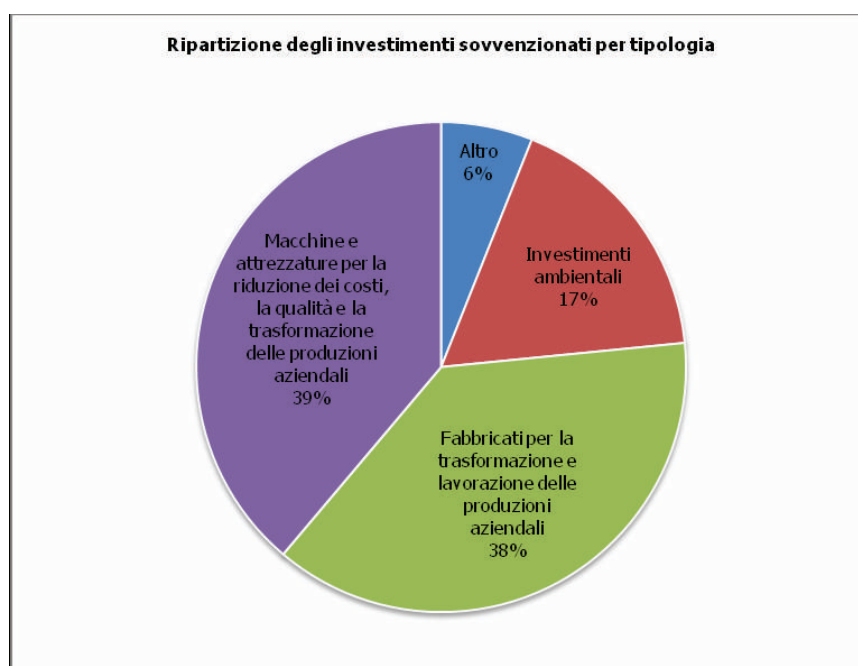


Tabella n. 13- Dato 2012 Valutazione Intermedia Agriconsulting su PSR Veneto 2007-2013

Approccio locale, le azioni del GAL Prealpi e Dolomiti: Il GAL Prealpi e Dolomiti ha finanziato tramite la Misura 121, 15 interventi e tramite la Misura 123, 6 interventi. Tra i criteri di priorità previsti nell'ambito del PSL veniva in particolare previsto al punto 5) per la Misura 121 un punteggio per le imprese formalmente iscritte alle iniziative Strada dei Formaggi e dei sapori delle Dolomiti Bellunesi, o Carta di Qualità del Parco Nazionale delle Dolomiti. Anche nell'ambito della Misura 123 il settore lattiero caseario è stato riconosciuto come settore strategico di intervento. Coerentemente con tale lettura del territorio, dei 21 interventi conclusi gli interventi hanno riguardato principalmente il settore lattiero caseario (11 interventi su 21). In particolare i contributi concessi hanno contribuito principalmente a finanziare: l'acquisto di nuovi macchinari, l'adeguamento tecnologico per la fase di trasformazione ed il miglioramento della fase di commercializzazione del prodotto.

MISURA 121 –Azione 1: Ammodernamento delle aziende agricole in montagna	
Obiettivo: Pur facendo riferimento, nel PSR per il Veneto 2007-2013, all'obiettivo specifico "1.4. Pro-muovere la crescita economica dei settori agricolo e alimentare sviluppando un sistema produttivo moderno e integrato con il territorio, la catena distributiva e il mercato", la Misura 121 risulta altresì coerente con gli obiettivi legati alla creazione di nuove opportunità imprenditoriali e di lavoro, in particolare all'obiettivo "3.3. Favorire la creazione e lo sviluppo delle microimprese". Gli obiettivi operativi, in termini di realizzazioni, sono, dunque, il sostegno alla competitività delle imprese agricole dell'area e l'integrazione nell'ambito di micro filiere di prodotti locali.	
Beneficiari: Imprese agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti (qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ed età inferiore a 65 anni).	
Formula attuativa	A bando
1° bando Approvato con deliberazione Consiglio Direttivo GAL: Pubblicazione bando: Chiusura lavori: Durata max interventi: Importo totale messo a bando:	n. 37 del 14/12/2010 pubblicato il 7 ottobre 2011 entro il 7 aprile 2013 18 mesi € 203.012,00
Numero Progetti finanziati:	4 - investimento attivato € 307.668,95 (contributo € 174.601,37)
2° bando Approvato con deliberazione Consiglio Direttivo GAL: Pubblicazione bando II: Chiusura lavori: Durata max interventi: Importo totale messo a bando:	n. 35 del 13/12/2012 pubblicato il 25 ottobre 2013 entro il 31 dicembre 2014 12 mesi € 252.759,32
Numero Progetti finanziati:	11 – investimento attivato € 433.913,48 (contributo € 221.054,66)

ANALISI INTERVENTI FINANZIATI (121.1)

Tipologia intervento realizzato: L'azione ha finanziato l'acquisto di attrezzature per il miglioramento della produzione. I settori produttivi di intervento sono stati: lattiero caseario (produzione e trasformazione del latte) n°6, vitivinicolo n°1, allevamento di capi di bestiame non destinati alla produzione di latte n°2, coltivazione di foraggio e mais n°6.

Indicatori di output: Il target di output è stato ampiamente superato (15 interventi finanziati su 4 previsti) così come il target finanziario (Volume totale degli investimenti € 741.582,43 rispetto ad un target di 320.000,00).

Indicatori di risultato: il dato relativo all'aumento del valore aggiunto lordo delle imprese finanziate ed il dato relativo al numero di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuovi processi, non sono verificabili.

MISURA 123 - Azione 1: Agroalimentare in montagna	
Obiettivo: Pur facendo riferimento, nel PSR per il Veneto 2007-2013, all'obiettivo specifico "1.4. Pro-muovere la crescita economica dei settori agricolo e alimentare sviluppando un sistema produttivo moderno e integrato con il territorio, la catena distributiva e il mercato" la Misura risulta coerente con gli obiettivi specifici di riferimento delle altre misure collegate al tema centrale del PSR, relativi alla creazione di nuove opportunità imprenditoriali e di lavoro, in particolare all'obiettivo "3.3. Favorire la creazione e lo sviluppo delle microimprese". Gli obiettivi operativi sono il sostegno alla competitività delle imprese agricole dell'area e l'integrazione nell'ambito di micro-filiere di prodotti locali.	
Beneficiari: Imprese che svolgono attività di trasformazione commercializzazione di prodotti agricoli.	
Formula attuativa	a bando
Approvato con deliberazione Consiglio Direttivo GAL:	n. 01 del 03/02/2011 (modificato il 28/07/2011)
Pubblicazione bando:	pubblicato il 25 novembre 2011
Chiusura lavori:	entro il 25 maggio 2013
Durata max interventi:	18 mesi
Importo totale messo a bando	€ 236.817,00
Numero Progetti finanziati:	6 – investimento attivato € 605.385,15 (contributo € 177.607,78)

ANALISI INTERVENTI FINANZIATI (123.1)

Tipologia intervento realizzato: 5 dei 6 gli interventi realizzati hanno riguardato il settore lattiero caseario: l'adeguamento tecnologico ha consentito una migliore gestione del latte con conseguente miglioramento della lavorazione e quindi del prodotto trasformato. L'intervento ha permesso ai beneficiari di mantenere uno standard produttivo tale da ottimizzare il rapporto latte conferito/quantità prodotta e quindi garantire un buon prezzo. Il sesto intervento invece ha riguardato una ditta specializzata nella produzione di salumi e vendita diretta di tagli di carne e salumi. L'intervento ha contribuito in questo caso al miglioramento del punto vendita permettendo un margine di crescita e potenziale sviluppo delle vendite dirette sia per i tagli di carne che per i salumi.


Tipologie di intervento:

- Adeguamento tecnologico per la fase di trasformazione 5 interventi
- Miglioramento della fase di commercializzazione 1 intervento


Indicatori di output: gli indicatori di output nel caso della Misura 123.1 non sono stati raggiunti. Il volume degli investimenti attivati è pari ad € 605.385,15 (target previsto € 750.000,00). Il numero di imprese beneficiarie è stato di 6 (rispetto ad un target previsto di 10). La motivazione del mancato raggiungimento del target è in parte dovuta alla compresenza di bandi regionali (attivati quindi direttamente dalla regione del Veneto) e bandi attivati da parte del GAL.

Indicatori di risultato: il dato relativo all'aumento del valore aggiunto lordo delle imprese finanziate ed il dato relativo al numero di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuovi processi, non sono verificabili.

Mappa degli interventi: MISURA 121 E MISURA 123

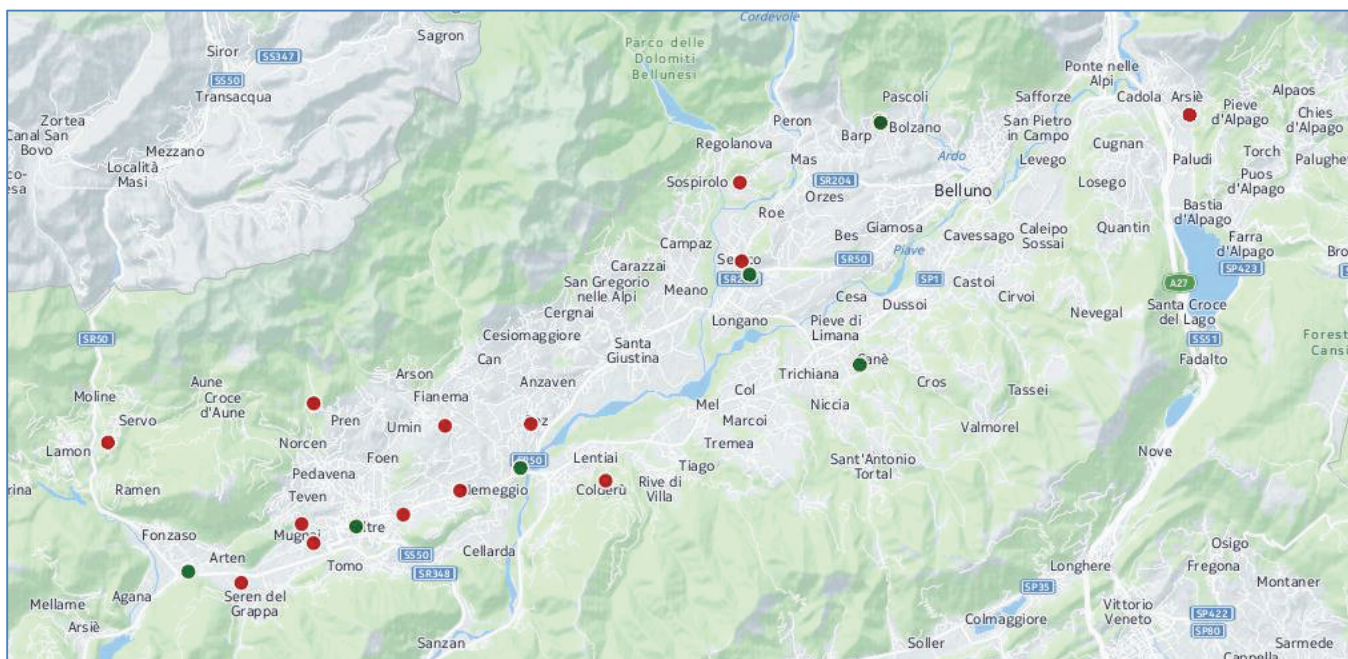

Localizzazione interventi finanziati attraverso la Misura 121 e la Misura 123 (mappa completa www.gal2.it)

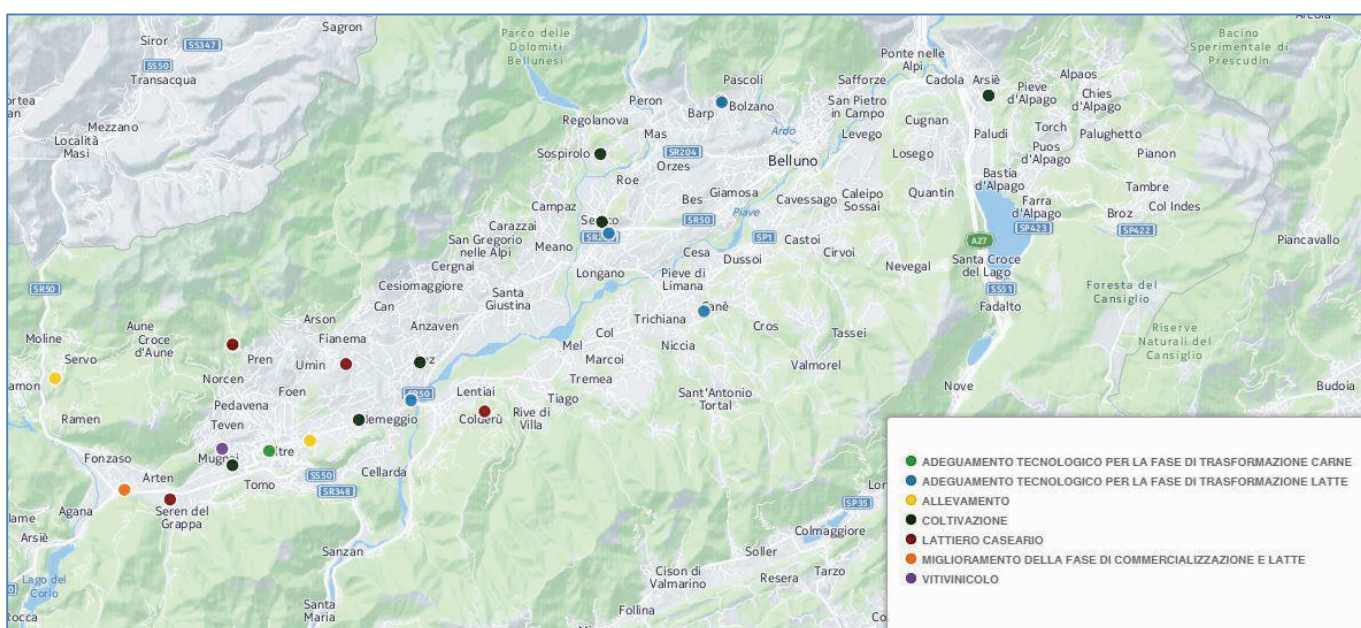

Gli interventi finanziati attraverso la Misura 121 e la Misura 123 per settore economico (mappa completa www.gal2.it)

3.2. MISURA 311

MISURA 311 - Diversificazione in attività non agricole

Approccio generale: partendo dal principio per cui la diversificazione può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e contribuire a migliorare l'equilibrio territoriale in termini economici e sociali, il Programma di Sviluppo Rurale ha sostenuto, attraverso la Misura 311, Azioni mirate a contribuire ad alcuni obiettivi specifici: sostenere la diversificazione delle attività agricole e promuovere il ruolo multifunzionale dell'impresa nelle aree rurali; Incentivare le attività ed i servizi turistici nelle aree rurali; Promuovere la produzione e l'utilizzo di energia da fonte rinnovabile di produzione locale; Sostenere l'occupazione femminile e/o l'inserimento della donna nel mondo del lavoro; Migliorare l'offerta e l'accesso ai servizi nelle aree rurali anche attraverso l'uso delle ICT.

Attraverso la Misura 311 a livello regionale, in particolare, sono stati attivati interventi relativi a alla creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali, quali fattorie sociali (agri nidi, ippoterapia, ecc.), fattorie didattiche, fattorie creative (produzioni artigianali aziendali, ecc.), eco-fattorie (servizi ambientali, ecc.) Azione 1, e interventi relativi allo Sviluppo dell'ospitalità agrituristica Azione 2. Gli interventi ammissibili riguardavano investimenti strutturali e acquisto attrezzature per lo svolgimento delle attività previste. In base alla relazione intermedia di Valutazione in itinere del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione del Veneto aggiornata a Dicembre 2012, è stato fatto un primo screening per capire in che misura gli investimenti sovvenzionati hanno promosso la diversificazione delle attività delle famiglie agricole in attività non agricole.

A livello regionale la Misura 311 ha finanziato 480 interventi (dati Portale Piave 11 dicembre 2014). Alla data di luglio 2012 tali interventi riguardavano prevalentemente aree rurali meno marginali (B) e interessavano prioritariamente aziende di dimensione economica più grande. Tale misura è stata quindi attuata prevalentemente come uno strumento per le realtà aziendali più forti per consolidarsi e per guadagnare ulteriori posizioni sul mercato, piuttosto che un mezzo per le aziende ed i territori più deboli e marginali per "sopravvivere" sul mercato in una fase di complessiva difficoltà economica.

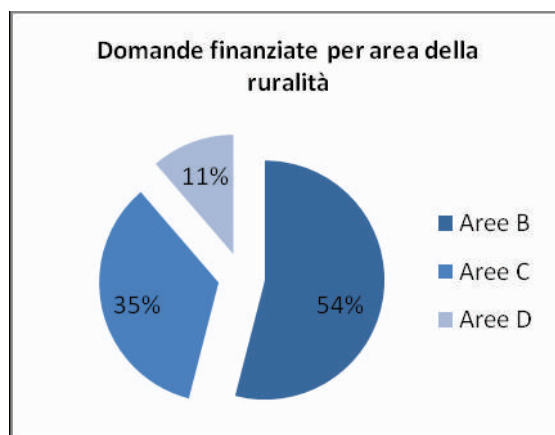


Tabella n. 14 - Valutazione Intermedia del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione del Veneto – Agriconsulting, Dicembre 2012

Sempre a livello regionale emerge come un ampio numero di progettualità abbia riguardato l'incremento dei posti letto agrituristici (oltre il 90% delle aziende beneficiarie indagate nell'ambito dell'azione 2). Fra le diverse azioni previste prevale con forza quella relativa all'agriturismo, che fa registrare circa il 60% della progettualità e della spesa.

Approccio locale, le azioni del GAL Prealpi e Dolomiti: tale tendenza sembra essere confermata dai dati relativi agli interventi attuati dal GAL Prealpi e Dolomiti poiché mentre attraverso l'Azione 1 - Creazione e consolidamento di fattorie pluri-funzionali è stato finanziato un unico progetto, nell'ambito della Azione 2 - Sviluppo dell'ospitalità agrituristica, 8 interventi su 9 hanno avuto l'obiettivo di sviluppare o migliorare una attività di ospitalità di tipo agrituristico/ricettivo.

MISURA 311 / AZIONE 1 - Creazione e consolidamento di fattorie pluri-funzionali

Obiettivo: In relazione all'obiettivo specifico del PSR per il Veneto 2007-2013 "3.1 Sostenere la diversificazione delle attività agricole e promuovere il ruolo multifunzionale delle imprese agricole", l'azione mira a migliorare la competitività del sistema territoriale, promuovendo lo sviluppo di nuove funzioni nelle imprese agricole, soprattutto negli ambiti dei servizi alla persona.

Beneficiari: Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Formula attuativa:	a bando
Approvato con deliberazione Consiglio Direttivo GAL:	n. 01 del 09/02/2010
Pubblicazione bando:	pubblicato il 27 agosto 2010
Chiusura lavori:	entro il 27 agosto 2012
Durata max interventi:	24 mesi
Importo totale messo a bando:	€ 180.000,00
Numero Interventi finanziati:	1 - investimento attivato €211.605,88 (contributo concesso €100.000,00)

ANALISI INTERVENTI FINANZIATI (311.1)

Tipologia intervento realizzato: nell'ambito dell'Azione 311.1 è stato finanziato un unico progetto finalizzato alla realizzazione di una Fattoria Didattica - sociale polifunzionale con relativa attività di accoglienza.

Indicatori di output: dei tre finanziamenti originariamente concessi due sono decaduti a causa della rinuncia dei beneficiari pervenuta in seguito alla assegnazione del contributo (rispettivamente del 50% e del 22% del valore totale dell'investimento). La rinuncia è stata determinata dalla ridotta assegnazione di contributi. Le avvenute rinunce hanno comportato il mancato raggiungimento del target: in relazione al numero di imprese beneficiarie finanziate, il target previsto era di 2 beneficiari, mentre il numero raggiunto è di un beneficiario dei finanziamenti. Il target finanziario previsto corrispondeva ad un volume totale di investimenti pari ad € 360.000,00. Il target raggiunto è pari ad € 211.605,88. La cifra non allocata è stata re-impegnata per finanziare altre diverse Misure/Azioni.

Indicatori di risultato: i dati necessari a quantificare il raggiungimento del target previsto (valutazione dell'incremento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie/numero di posti di lavoro creati) dovranno essere necessariamente raccolti attraverso un confronto con i beneficiari.

MISURA 311/ AZIONE 2 - Sviluppo dell'ospitalità agrituristica

Obiettivo: In relazione all'obiettivo specifico del PSR per il Veneto 2007-2013 "3.1. Sostenere la diversificazione delle attività agricole e promuovere il ruolo multifunzionale dell'impresa" l'azione ha l'obiettivo operativo di incrementare l'offerta turistico-ricettiva dell'area, mediante l'incentivazione alla creazione di nuove imprese agrituristiche e il miglioramento delle strutture, delle dotazioni e dei servizi delle imprese agrituristiche esistenti.

Beneficiari: Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Formula attuativa:	a bando
Approvato con deliberazione Consiglio Direttivo GAL:	n. 02 del 09/02/2010
Pubblicazione bando:	pubblicato il 27 agosto 2010
Chiusura lavori:	entro il 27 agosto 2012
Durata max interventi:	24 mesi
Importo totale messo a bando:	€ 800.000,00
Numero Interventi finanziati:	9 - investimento attivato € 1.810.883,74 (contributo concesso € 772.935,10)


ANALISI INTERVENTI FINANZIATI (311.2)

Tipologia intervento realizzato: nell'ambito dell'Azione 311.2 sono stati finanziati 9 interventi. Dei 9 interventi finanziati 8 hanno avuto l'obiettivo di sviluppare o migliorare una attività di ospitalità di tipo agrituristico/ricettivo. Dei 9 interventi realizzati 6 hanno previsto, assieme alla realizzazione di interventi atti alla creazione di nuovi posti letto e miglioramento di servizi di ospitalità, anche la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici. Un unico progetto invece ha previsto l'esclusiva realizzazione di pannelli solari termici.

Indicatori di output: il target finanziario raggiunto è del 90.5% (€1.810.883,74 su €2.000.000,00). Il numero di beneficiari rispetto al target previsto e di 9 imprese finanziate su 5 previste. Il numero di posti letto realizzati (target previsto n.20) è stato ampiamente superato: n. 88 posti letto creati. Si registra un'unica rinuncia relativa all'Azione 2/Misura 311 dovuta a problemi tecnici e ritardo nella ricezione dell'autorizzazione a costruire da parte del beneficiario e la quota bassa del cofinanziamento concesso, conseguentemente l'impossibilità a realizzare i lavori nei tempi richiesti.

Indicatori di risultato: i dati necessari a quantificare il raggiungimento del target previsto (valutazione dell'incremento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie/numero di posti di lavoro creati) dovranno essere necessariamente raccolti attraverso un confronto con i beneficiari.

Mapa degli interventi: MISURA 311

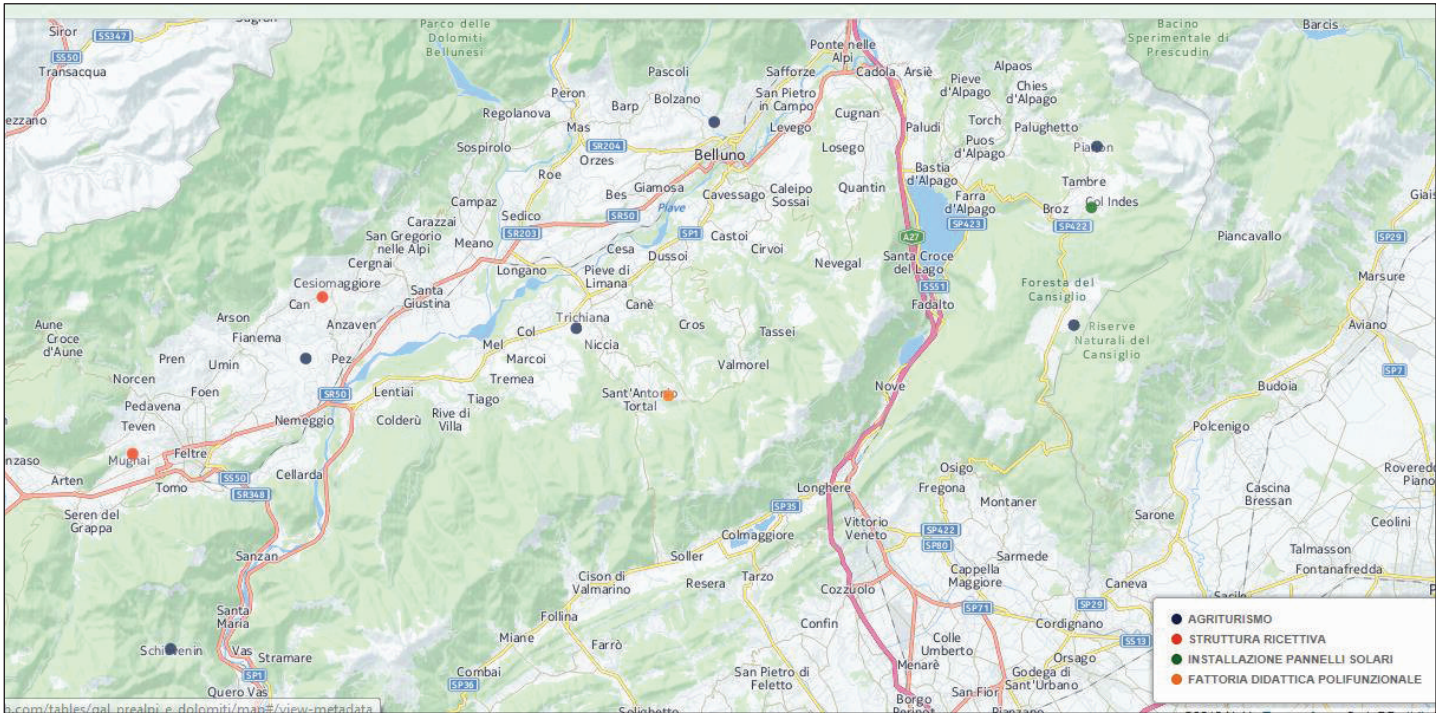

Localizzazione interventi finanziati attraverso la Misura 311.1 e 311.2 e tipologia di intervento (mappa completa www.gal2.it)

3.3. MISURA 312

MISURA 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

Approccio generale: la Misura poteva essere attuata esclusivamente attraverso i Piani di Sviluppo Locale ai sensi dell'Asse 4, e attraverso i Progetti Integrati di Area attivati da partenariati pubblico-privati di cui alla Misura 341.

A livello regionale la Misura 312 ha finanziato 136 progetti (dati Portale Piave 11 dicembre 2014), tutti in ambito Leader. Alla data di luglio 2012 oltre i due terzi delle microimprese beneficiarie già erano presenti sul mercato al momento della domanda: prevalendo fra queste (il 57%) le piccole imprese artigianali (soprattutto lavorazione del legno), mentre le microimprese che hanno avviato l'attività grazie al sostegno operavano per la quasi totalità nel settore turistico.

In base alla relazione intermedia di Valutazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione del Veneto l'intervento sovvenzionato opera dunque verso il consolidamento delle microimprese artigianali già operanti, attraverso investimenti che mirano soprattutto ad innovazioni di prodotto e di processo necessarie ad un riposizionamento delle stesse sul mercato verso segmenti a più alto valore aggiunto, mentre viene stimolata la nascita di nuovi soggetti imprenditoriali nel campo del turismo, con l'apertura di attività di pernottamento e di ristorazione. Marginale l'intervento in altra direzione (servizi ed energia: meno del 15% della progettualità finanziata).

Approccio locale, le azioni del GAL Prealpi e Dolomiti: Attraverso l'approccio LEADER nell'area del GAL Prealpi e Dolomiti l'Azione attivata all'interno della Misura 312 ha riguardato in particolare la creazione e lo sviluppo di microimprese dei settori del commercio e dell'artigianato (Azione 1) ed ha finanziato quindi sia imprese neo costituite che imprese già esistenti al momento della domanda. Ai fini dell'ammissibilità della domanda i beneficiari erano tenuti a presentare un business plan volto a dimostrare un incremento del rendimento globale, nel caso di microimpresa esistente, o le prospettive economiche, nel caso di microimprese di nuova costituzione. Gli interventi ammissibili hanno riguardato investimenti strutturali, acquisto di attrezzatura, investimenti immateriali, comprese consulenze tecniche, spese di gestione per l'avvio dell'attività.

MISURA 312 / AZIONE 1 - Creazione e sviluppo di microimprese

In relazione agli obiettivi specifici del PSR per il Veneto 2007-2013 "3.3. Favorire la creazione e lo sviluppo delle microimprese" e "3.5. Sostenere l'occupazione femminile e/o l'inserimento della donna nel mondo del lavoro", l'azione ha l'obiettivo operativo di sostenere la creazione e lo sviluppo di microimprese.

Beneficiari: Microimprese esistenti o di nuova costituzione ex art. 54 Reg. CE 1698/2005

Formula attuativa

A bando

Approvato con deliberazione Consiglio Direttivo GAL:

n. 03 del 09/02/2010

Pubblicazione bando I:

pubblicato il 27 agosto 2010

Chiusura lavori:

entro il 27 agosto 2012

Durata max interventi:

24 mesi

Importo totale messo a bando:

€1.000.000,00 (nuove imprese 400.000,00 + esistenti 600.000,00)

Approvato con deliberazione Consiglio Direttivo GAL: Pubblicazione bando II: Chiusura lavori: Durata max interventi: Importo totale messo a bando:	n. 02 del 19/02/2013 pubblicato il 15 novembre 2013 entro il 31 dicembre 2014 24 mesi € 369.519,12
Numero Interventi finanziati:	Primo bando: 6 nuove imprese - investimento attivato €1.028.692,55 (contributo € 397.283,33) 11 imprese esistenti - investimento attivato € 842.575,18 (contributo € 385.385,91) Secondo bando: 16 imprese esistenti - investimento attivato € 896.875,34 (contributo € 369.519,12)


ANALISI INTERVENTI FINANZIATI (312.1)

Tipologia intervento realizzato: l'Azione 312 è stata finanziata tramite due bandi: il primo ha previsto il finanziamento di due target distinti i neo imprenditori e gli imprenditori già esistenti. Il secondo invece era rivolto indistintamente ad entrambe le categorie. Per entrambi è stato richiesto l'invio di un business plan che prevedesse anche la definizione di un piano di ritorno economico triennale. In relazione alle nuove attività avviate si registra una forte presenza del settore ricettivo extra alberghiero: 5 interventi richiesti su 6 hanno infatti riguardato l'avvio di attività ricettiva con la creazione di un numero di posti letto indicativo di 34. In relazione alle attività già esistenti gli interventi si sono concentrati invece su attività di supporto all'innovazione di prodotti e di processi in vari ambiti produttivi legati soprattutto alla attività artigianale, in particolare su 27 interventi finanziati 10 hanno riguardato il settore dell'arredamento e della lavorazione del legno.

Indicatori di output: nonostante le tre rinunce pervenute il target previsto è stato raggiunto con un numero di microimprese beneficiarie di 33 rispetto al target previsto (10 microimprese) ed un volume totale degli investimenti di € 2.768.143,07 rispetto al target previsto di € 2.500.000,00.

Indicatori di risultato: i dati necessari a quantificare il raggiungimento del target previsto (valutazione dell'incremento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie/numero di posti di lavoro creati) dovranno essere necessariamente raccolti attraverso un confronto con i beneficiari. In base ai business plan presentati, la previsione di utile di esercizio (incremento del rendimento globale valutato sulla base dell'utile di esercizio prima e dopo l'intervento) mostra una netta prospettiva di crescita del valore aggiunto lordo di origine non agricola delle microimprese beneficiarie derivante dall'investimento effettuato. Tuttavia la valutazione di tale indicatore non è al momento verificabile non essendo ancora trascorso il periodo di tre anni dalla conclusione degli interventi.

La mappa degli interventi: MISURA 312

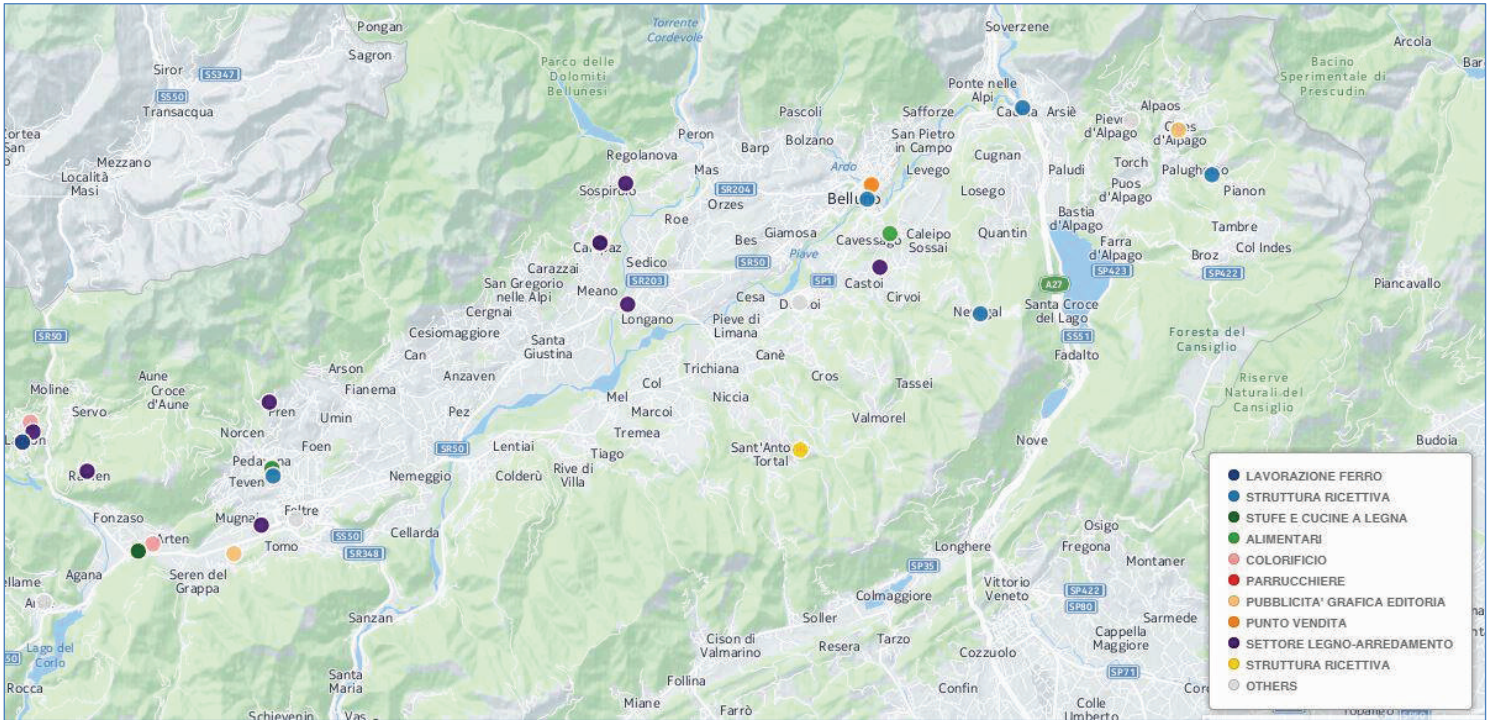

Localizzazione interventi finanziati attraverso la Misura 312 e tipologia di interventi (mappa completa www.gal2.it)

3.4. MISURA 227

MISURA 227 - Investimenti forestali non produttivi

Approccio generale: l'obiettivo della Misura 227 è quello di sostenere specifici investimenti forestali e interventi selvicolturali connessi all'adempimento di impegni che rappresentano un costo netto per il proprietario, senza fornire alcun reddito, ma, tesi comunque a valorizzare le foreste in termini di pubblica utilità e di miglioramento ambientale.

Gli interventi hanno finalità esclusivamente di tipo paesaggistico ambientale e comprendono sia la protezione e valorizzazione del territorio forestale sia il miglioramento della fruibilità turistico - ricreativa dei boschi a vocazione non produttiva.

Gli obiettivi specifici e operativi previsti a livello regionale sono i seguenti: a) aumentare la resistenza dei boschi agli stress abiotici generati dai cambiamenti climatici e consentirne il miglioramento della relativa stabilità ecologica ovvero il potenziamento della stabilità meccanica individuale e del popolamento (riduzione della suscettività a schianti/stroncamenti da neve o vento); b) tutelare e valorizzare gli ecosistemi forestali attraverso la realizzazione/ripristino di biotopi forestali in grado di aumentare la biodiversità presente; c) garantire la manutenzione ambientale e lo sviluppo dei servizi finalizzati a migliorare la fruibilità e l'uso multifunzionale delle risorse forestali.

A livello regionale, a valere sulla Misura 227, risultano finanziate 272 domande per un investimento complessivo di circa 12 Meuro. L'azione prevalente, sempre a livello regionale, in termini di numero di domande e di investimento complessivo è stata L'Azione 1 "miglioramenti paesaggistico ambientali", la quale ha interessato il recupero e la manutenzione straordinaria di sentieri, percorsi didattici e strade forestali.

Approccio locale, le azioni del GAL Prealpi e Dolomiti: il GAL Prealpi e Dolomiti ha attivato, nell'ambito della Misura 227 Azione 1, 4 interventi. Un elemento di valutazione relativo al valore aggiunto prodotto dagli investimenti realizzati nell'ambito della Misura 227 è stato l'integrazione funzionale dell'investimento finanziato con altre infrastrutture territoriali già presenti o progettate per il futuro nel territorio.

I quattro interventi realizzati nell'area del GAL Prealpi e Dolomiti risultano pertinenti rispetto a tali requisiti e complementari rispetto all'obiettivo operativo di garantire la manutenzione ambientale e lo sviluppo dei servizi finalizzati a migliorare la fruibilità e l'uso multifunzionale delle risorse forestali locali. Tali interventi infine coerentemente all'analisi svolta a livello regionale hanno contribuito a rendere fruibile il patrimonio forestale locale favorendo la frequentazione di aree di elevato valore naturale e paesaggistico ove il ripristino della segnaletica, dei punti di informazione, delle staccionate e delle aree attrezzate, realizzati secondo standard codificati rappresenta un importante fattore per lo sviluppo delle attività turistiche nelle aree di intervento.

MISURA 227 - Azione 1: Miglioramenti paesaggistico-ambientali

Obiettivo: L'azione fa riferimento, nel PSR per il Veneto 2007-2013, all'obiettivo specifico "2.6 Favorire la conservazione e la valorizzazione delle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico e la biodiversità ad esse collegata". Essa risulta altresì coerente con l'obiettivo specifico del PSR "3.7. Migliorare, conservare e valorizzare il patrimonio rurale". Infine essa persegue l'obiettivo operativo di garantire la manutenzione ambientale e lo sviluppo dei servizi finalizzati a migliorare la fruibilità e l'uso multifunzionale delle risorse forestali locali.

Beneficiari: Proprietari privati di foreste, associazioni, consorzi di proprietari privati di foreste, comuni o comunità montane.

Formula attuativa:	a bando
Approvato con deliberazione Consiglio Direttivo GAL:	n. 05 del 08/03/2011
Deliberazione:	21 ottobre 2011
Chiusura lavori:	21 ottobre 2013
Durata max interventi:	24 mesi
Importo totale messo a bando:	€ 245.121,00
Numero Interventi finanziati:	4 - investimento attivato € 277.103,63 (contributo € 233.846,99)

ANALISI INTERVENTI FINANZIATI (227.1)

Tipologia intervento realizzato: Il Gal Prealpi e Dolomiti ha finanziato nell'ambito dell'Azione 1 Misura 227, 4 interventi, in particolare:


- l'intervento realizzato dal Comune di Feltre riqualificazione ambientale e realizzazione percorso pedonale lungo il torrente Musil in località Mugnai ha previsto la realizzazione di rinforzo della sponda del torrente, la realizzazione di tratti di parapetto il posizionamento di una passerella pedonale, arredi e segnaletica per favorire la fruibilità del percorso. Il percorso si inserisce nella proposta di itinerari ciclistici collegati alla Lunga Via delle Dolomiti e promossi attraverso il Progetto Interreg Bike Tourism – tappa 5 Cergnai - Arsiè.
- l'intervento realizzato da parte de Comunità Montana Bellunese Ponte nelle Alpi si inserisce e completa la mappa sentieristica del Nevegal e nel percorso dell'Ecomuseo di Ponte nelle Alpi.
- l'Associazione Monte Grappa attraverso l'intervento di manutenzione straordinaria del percorso tematico dei Fojaroi si inserisce nell'itinerario che dalla Val di Resele fino a Valpore di Fondo collega le principali strutture con tetto a foglia di faggio (denominate appunto Fojaroi) nel Comune di Seren del Grappa che a sua volta si collega ad altri itinerari esistenti.
- tale ultimo intervento inoltre si collega alla realizzazione di un percorso didattico terrazzato realizzata da soggetto privato nel medesimo territorio.

E' possibile quindi confermare che, come anche risulta dai dati regionali, tali investimenti sono potenzialmente efficaci rispetto all'obiettivo di favorire una fruizione turistica sostenibile in termini ambientali e rafforzare e valorizzare gli elementi paesaggistici, culturali e storici che rafforzano l'identità e il senso di appartenenza delle comunità locali.

Indicatori di output: l'azione ha interessato 2 beneficiari pubblici e due beneficiari privati ed ha permesso la realizzazione e riqualificazione di percorsi pedonali e tematici (n°3), nonché la realizzazione di un orto didattico terrazzato per disabili, n°1. Il target è quindi stato raggiunto (Numero di proprietari di foreste beneficiari 4 su target n.3). Volume totale degli investimenti € 277.103,63, su target € 285.714,00.

Indicatori di risultato: il target di risultato relativo alla superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, in base al calcolo dei KM lineari interessati dagli interventi svolti (target previsto 20 km lineari) è stato raggiunto.

La mappa degli interventi: MISURA 227

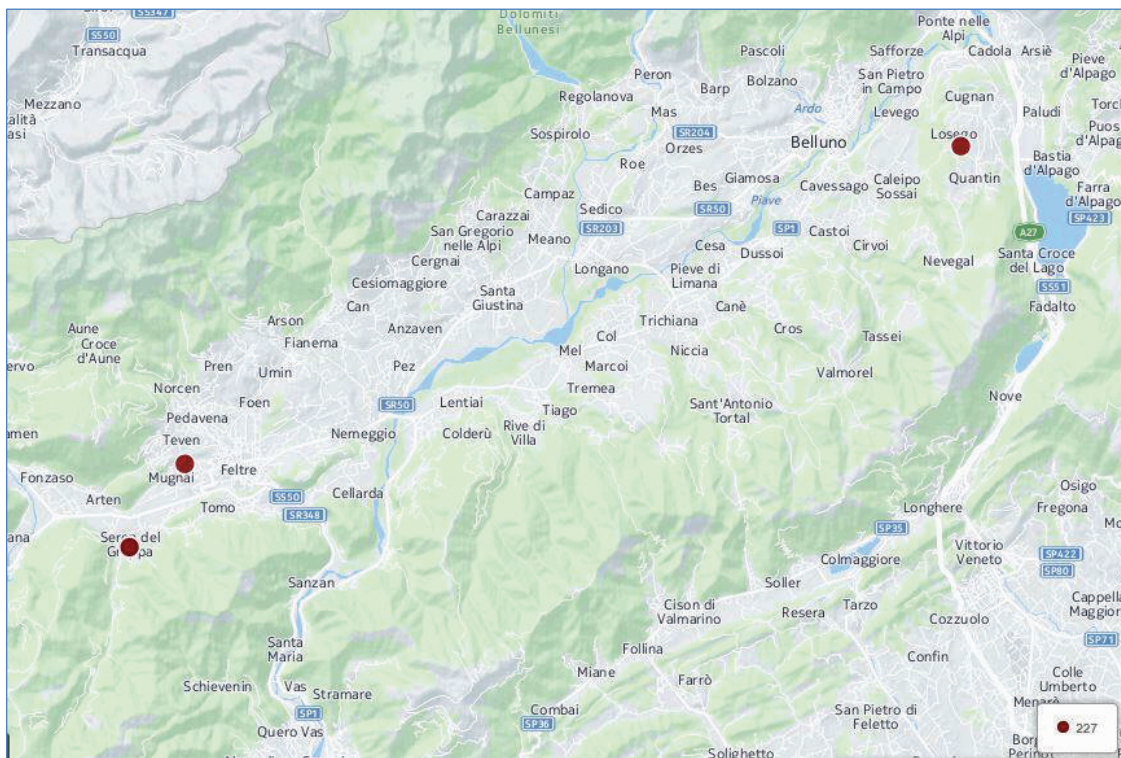

Localizzazione interventi finanziati attraverso la Misura 227 (mappa completa www.gal2.it)

3.5. MISURA 331

MISURA 331 - Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali

Approccio generale: la finalità della Misura 331 è stata quella di promuovere una forza lavoro competente ed una nuova imprenditorialità a supporto dell'azione di sviluppo del territorio rurale. In particolare essa mirava, attraverso lo sviluppo di competenze ed abilità relative ad attività non prettamente agricole, come quelle artigianali e turistiche, connesse anche alla valorizzazione del territorio, a concorrere al miglioramento delle condizioni di vita delle collettività che vivono e lavorano nelle zone agricole e montane e alla creazione di nuove opportunità di lavoro. Tale Misura ha avuto quindi un ruolo di supporto alla strategia complessiva di sviluppo delle aree rurali sostenuta dalle misure dell'Asse 3, attraverso la diversificazione economica, lo sviluppo del turismo rurale, la creazione di microimprese e di servizi alla popolazione, e riguarda quindi tutti i settori produttivi strettamente collegati con il sistema rurale.

La Misura poteva essere attuata dagli operatori economici impegnati nei settori interessati dagli interventi dell'Asse 3, in particolare per l'Azione 1 - Interventi a carattere collettivo di formazione, educazione ambientale e sul territorio, i soggetti beneficiari erano esclusivamente gli organismi di formazione accreditati; mentre per l'Azione 2 - Partecipazione su richiesta individuale a corsi e a stage formativi, i beneficiari erano gli imprenditori e membri della famiglia agricola e operatori economici coinvolti nell'ambito delle iniziative dell'Asse 3 del PSR. Infine l'Azione 3 - Attività di formazione e informazione, vedeva come unico beneficiario la Regione stessa. A livello regionale tramite la Misura 331 sono state realizzate 95 iniziative informative, (tra l'azione azione 1 e l'azione 3). A luglio 2012 (valutazione intermedia regionale) avevano partecipato alle attività formative oltre 1200 soggetti ai quali sono state trasferite informazioni riguardanti tematiche che concernono la diversificazione delle attività agricole, il turismo e la tutela del patrimonio rurale. Alle attività informative hanno partecipato quasi in egual misura uomini e donne.

Approccio locale, le azioni del GAL Prealpi e Dolomiti: nell'area del GAL Prealpi e Dolomiti sono stati finanziati 4 diversi beneficiari per un totale di 17 interventi formativi ed informativi nell'ambito della Misura 331 Azione 1, a cui hanno partecipato 367 partecipanti di cui 238 per la sola attività di formazione per un totale di 621 ore di formazione e 40 ore di attività informativa.

MISURA 331 – AZIONE 1: Interventi a carattere collettivo di formazione, educazione ambientale e sul territorio.

Obiettivo: In relazione all'obiettivo specifico del PSR per il Veneto 2007-2013 "3.8. Qualificare il capitale umano per favorire sviluppo delle competenze e capacity building", l'obiettivo operativo dell'azione consiste nell'attuazione di iniziative di tipo formativo e/o informativo, finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: a) sviluppo di capacità e competenze per il ri-orientamento produttivo finalizzato alla diversificazione aziendale in attività non agricole, in particolare agrituristiche; b) sviluppo di capacità e di informazione relative alla valorizzazione del paesaggio e delle risorse locali, al turismo sostenibile, alle attività economiche di tipo ricreativo-culturale e sociale legate a pratiche tradizionali e di qualità, ai servizi ambientali e alla tutela del territorio; c) sviluppo e consolidamento di capacità e abilità imprenditoriali e gestionali per la creazione di piccole imprese connesse alle attività rurali, alla valorizzazione di prodotti del territorio, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ai servizi locali, nonché alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Beneficiari: Organismi di formazione accreditati

Formula attuativa:	a bando
Approvato con deliberazione Consiglio Direttivo GAL:	n.09/02/2010 (modificato il 24/04/2012)
Pubblicazione bando:	pubblicato il 9 luglio 2010
Chiusura lavori:	entro il 9 gennaio 2013 (concessa proroga di 6 mesi)
Durata max interventi:	30 mesi
Importo totale messo a bando:	€ 100.000,00
Numero Interventi finanziati:	4 - investimento attivato € 99.161,00 (contributo € 99.161,00)

ANALISI INTERVENTI FINANZIATI (331.1)

Tipologia intervento realizzato: nell'ambito della Misura 331 sono stati finanziati 4 differenti beneficiari. Le attività formative hanno riguardato due dei tre obiettivi specifici previsti ovvero:

- sviluppo e consolidamento di capacità e abilità imprenditoriali e gestionali per la creazione di piccole imprese connesse alle attività rurali, alla valorizzazione di prodotti del territorio, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ai servizi locali, nonché alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (due beneficiari).
- sviluppo di capacità e di informazione relative alla valorizzazione del paesaggio e delle risorse locali, al turismo sostenibile, alle attività economiche di tipo ricreativo - culturale e sociale legate a pratiche tradizionali e di qualità, ai servizi ambientali e alla tutela del territorio (due beneficiari).

Indicatori di output: Si registra la rinuncia da parte di uno dei beneficiari al contributo dovuta alla bassa percentuale di cofinanziamento concessa (3,3%). Il target finanziario raggiunto è comunque del 99% (volume totale degli investimenti, target previsto € 100.000,00, target raggiunto € 99.161,00). In totale il numero di operatori economici partecipanti alle attività sovvenzionate è di 367 persone (target previsto 80 persone) per un totale di 621 ore di formazione e 40 ore di attività informativa (target previsto 625 ore).

Indicatori di risultato: In relazione alla sola formazione hanno terminato con successo i corsi 238 persone. Il target di risultato dato (minimo 50 partecipanti) è stato quindi ampiamente superato.

3.6. MISURA 313

MISURA 313 - Incentivazione delle attività turistiche

Approccio generale: il valore strategico del settore turistico per quanto riguarda le zone rurali è riconosciuto dal PSR Veneto 2007- 2013. Il turismo nelle zone rurali può essere considerato una delle più importanti forme di "turismo emergente", di grande potenzialità per il territorio veneto, e fattore-chiave per lo sviluppo delle aree rurali nel medio-lungo periodo, in quanto capace di integrarsi in modo efficace con un'offerta turistica già consolidata nei tradizionali segmenti (turismo balneare e montano, turismo termale, città d'arte).

L'obiettivo generale della Misura è stato quello di incentivare le attività turistiche nelle aree rurali attraverso l'attivazione di interventi a carattere infrastrutturale e lo sviluppo di servizi finalizzati a promuovere, potenziare e migliorare sul piano qualitativo l'offerta turistica nelle aree rurali.

Nelle aree C e D la Misura 313 era attuabile esclusivamente da parte dei GAL tramite i propri Piani di Sviluppo Locale attraverso l'Asse 4. La Misura prevedeva come potenziali beneficiari Enti locali territoriali (Comuni, Provincie, Comunità montane), Associazioni agrituristiche, Associazioni per la gestione delle Strade del Vino e dei prodotti tipici, costituite ai sensi della L.R. 17/2000, Consorzi di promozione turistica, Associazioni, allo scopo costituite, tra soggetti pubblici e privati.

Poiché la Misura 313 è stata attivata principalmente nel corso del 2013 e 2014, non vi sono elementi di rilievo nell'ambito della valutazione intermedia condotta, a cui fare riferimento per quanto riguarda i dati regionali. In relazione ai dati disponibili su portale regionale Piave, l'importo totale stanziato dai GAL Veneti in relazione alla Misura 313 rappresenta il 27,74%, del totale a conferma del valore riconosciuto a tale tipologia di interventi tramite l'approccio Leader. Il contributo concesso dal GAL Prealpi e Dolomiti in particolare in relazione alla Misura 313 rappresentano il 26,16% del totale.

Approccio locale, le azioni del GAL Prealpi e Dolomiti: la Misura 313 ha permesso al GAL Prealpi e Dolomiti di promuovere interventi di valorizzazione turistica con particolare riguardo allo sviluppo di itinerari, realizzazione ed adeguamento di piccole strutture di accoglienza e informazione turistica, potenziamenti dei servizi ricettivi ed azioni di informazione e promozione.

Tenendo conto del valore dato, in termini di priorità dal PSR Veneto 2007-2013 rispetto al requisito della prossimità degli interventi ad aree di alto pregio naturale ed agli approcci di tipo integrato (Progetti integrati di area) si rileva che per quanto riguarda il primo requisito questo è stato soddisfatto, da parte del GAL Prealpi e Dolomiti, soprattutto in relazione agli interventi di infrastrutturazione legati alle strutture di accoglienza ed informazione turistica finanziati attraverso l'Azione 2 come menzionato di seguito, mentre il secondo requisito è soddisfatto dal fatto che i beneficiari dell'Azione 1, Azione 3 ed Azione 4 con competenza sovracomunale, hanno sviluppato interventi strutturali ed investimenti coerenti ad una pianificazione integrata d'area.

Il GAL Prealpi e Dolomiti ha finanziato con la Misura 313, attraverso finanziamenti a regia, un totale di 16 interventi per un contributo pubblico concesso pari ad € 1.598.877,24.

MISURA 313 - AZIONE 1: Itinerari

Obiettivo: In relazione all'obiettivo specifico del PSR per il Veneto 2007-2013 "3.2. Incentivare le attività e i servizi turistici nelle aree rurali", l'azione ha come obiettivo operativo il potenziamento delle infrastrutture di accesso all'area a fini di fruizione turistica secondo un approccio coordinato e integrato rispetto a quanto già realizzato sul territorio oppure a quanto in corso di realizzazione o in programmazione.

Beneficiari: Enti locali, associazioni agrituristiche, consorzi di promozione turistica, associazioni pubblico private.

Formula attuativa:	a regia
Pubblicazione:	26 agosto 2011
Chiusura lavori:	26 agosto 2013
Durata max interventi:	24 mesi
Importo totale messo a bando:	€ 500.000,00
Numero Interventi finanziati:	2 - investimento attivato € 257.404,65 (contributo € 179.098,81)
Formula attuativa:	a regia
Pubblicazione:	6 luglio 2012
Chiusura lavori:	6 luglio 2014
Durata max interventi:	24 mesi
Importo totale messo a bando:	€ 200.000,00
Numero Interventi finanziati:	2 - investimento attivato € 285.713,70 (contributo € 199.999,59)
Formula attuativa:	a regia
Pubblicazione:	25 gennaio 2013
Chiusura lavori:	31 dicembre 2014 (prorogato)
Durata max interventi:	23 mesi
Importo totale messo a bando:	€ 256.000,00
Numero Interventi finanziati:	1 - investimento attivato € 252.220,00 (contributo € 252.220,00)
Formula attuativa:	a regia
Pubblicazione:	6 dicembre 2013
Chiusura lavori:	31 dicembre 2014
Durata max interventi:	12 mesi
Importo totale messo a bando:	€ 109.181,10
Numero Interventi finanziati:	1 - investimento attivato € 109.181,10 (contributo € 109.181,10)

ANALISI INTERVENTI FINANZIATI (313.1)

Tipologia intervento realizzato: L'azione ha previsto il finanziamento di interventi relativi alla sistemazione e miglioramento di itinerari con sistemazione dei tracciati, posizionamento di panchine, cartelli, bacheche e tabelle informative.

Indicatori di output: Il target di output è stato raggiunto per quanto riguarda il numero di itinerari finanziati (target previsto 8, valore raggiunto 15). La determinazione, da parte della Regione del Veneto di una quota di contributo maggiore a partire dal 2013 pari al 100% della spesa ammessa ha determinato il mancato raggiungimento del target finanziario in quanto a parità di contributi ammessi il valore totale degli investimenti attivati è diminuito (target previsto € 1.142.857,00; target raggiunto € 904.518,87).

Indicatori di risultato: per quanto riguarda l'incremento del numero di turisti nell'area interessata dagli interventi, la valutazione di tale indicatore non è al momento verificabile non essendo ancora trascorso un periodo sufficientemente ampio dalla conclusione degli interventi, inoltre tale indicatore richiede un confronto con dati statistici e dati rilevati dai beneficiari sul territorio al momento non reperibili.

MISURA 313 - AZIONE 2: Accoglienza	
Obiettivo: In relazione all'obiettivo specifico del PSR per il Veneto 2007-2013 "3.2. Incentivare le attività e i servizi turistici nelle aree rurali", l'azione mira a potenziare le infrastrutture di accoglienza e informazione turistica secondo un approccio coordinato e integrato rispetto a quanto già realizzato sul territorio oppure a quanto in corso di realizzazione o in programmazione.	
Beneficiari: Enti locali, associazioni agrituristiche, consorzi di promozione turistica, associazioni pubblico private.	
Formula attuativa:	a regia
Pubblicazione:	14 gennaio 2011
Chiusura lavori:	14 gennaio 2013
Durata max interventi:	24 mesi
Importo totale messo a bando:	€ 297.990,38
Numero Interventi finanziati:	5 - investimento attivato € 506.657,54 (contributo € 251.341,05)
Formula attuativa:	a regia
Pubblicazione:	15 giugno 2012
Chiusura lavori:	15 dicembre 2013
Durata max interventi:	18 mesi
Importo totale messo a bando:	€ 202.009,62
Numero Interventi finanziati:	2 - investimento attivato € 398.967,46 (contributo € 197.671,79)

ANALISI INTERVENTI FINANZIATI (313.2)

Tipologia intervento realizzato: attraverso la Misura 313.2 sono stati effettuati interventi di infrastrutturazione sistemazione di edifici adibiti a punto di informazione turistica, e accoglienza in sette località. Degli interventi finanziati due hanno previsto anche la realizzazione di spazi polifunzionali a supporto delle manifestazioni sportive ed attività locali. Tutti gli interventi si collocano in aree di particolare interesse dal punto di vista turistico perché adiacenti a percorsi escursionistici (Via Claudia Augusta) o a punti di particolare interesse turistico (Castello di Zumelle).

Indicatori di output: attraverso i sette interventi finanziati sono state realizzate otto strutture di accoglienza a fronte di un target previsto di 5. L'indicatore quantitativo è stato quindi raggiunto. Per quanto riguarda il volume totale degli investimenti realizzati la % raggiunta rispetto al target è del 90% circa (target previsto € 1.000.000,00; target raggiunto € 905.625,00). Il mancato raggiungimento del target è dovuto ad una rinuncia da parte di un beneficiario pubblico in seguito a difficoltà nel garantire il cofinanziamento dell'intervento.

Indicatori di risultato: per quanto riguarda l'incremento del numero di turisti nell'area interessata dagli interventi, la valutazione di tale indicatore non è al momento verificabile in quanto tale indicatore richiede un confronto con dati statistici e dati rilevati dai beneficiari sul territorio al momento non reperibili.

MISURA 313 - AZIONE 3: Servizi	
Obiettivo: In relazione all'obiettivo specifico del PSR per il Veneto 2007-2013 "3.2. Incentivare le attività e i servizi turistici nelle aree rurali", l'azione ha l'obiettivo operativo di incentivare la creazione e lo sviluppo di servizi e progetti finalizzati a promuovere, secondo criteri e metodologie innovative e concertate tra gli operatori, l'incontro tra domanda e offerta di turismo.	
Beneficiari: Enti locali, associazioni agrituristiche, consorzi di promozione turistica, associazioni pubblico private.	
Formula attuativa:	a regia
Pubblicazione:	15 giugno 2012
Chiusura lavori:	31 dicembre 2014
Durata max interventi:	30 mesi
Importo totale messo a bando:	€ 199.800,00
Numero Interventi finanziati:	1 - investimento attivato € 290.000,00 (contributo € 125.731,66)

ANALISI INTERVENTI FINANZIATI (313.3)

Tipologia intervento realizzato: attraverso l'Azione 313.3 è stata realizzata una attività di promozione turistica. Il progetto ha avuto le seguenti finalità: costruzione e commercializzazione di pacchetti turistici unitari, realizzazione di un brand turistico territoriale (Valle Unica), realizzazione di materiale cartaceo e multi mediale per la promozione degli itinerari, organizzazione eventi promozionali.

Indicatori di output: Attraverso la Misura 313.3 è stato finanziato un unico beneficiario (target previsto 2 progetti finanziati). La scelta è stata determinata dalla volontà di garantire un approccio il più possibile unitario e condiviso per quanto riguarda lo sviluppo di servizi turistici nell'area del GAL Prealpi e Dolomiti. La scelta è stata inoltre determinata dalla esclusiva competenza del soggetto beneficiario per quanto riguarda le attività promozionali realizzate. Le attività previste nell'ambito del progetto finanziato sono state soggette ad una variazione con conseguente riduzione di budget dovuta alla necessità di coordinare tale azione con gli interventi finanziati nell'ambito della Misura 313.4. L'indicatore finanziario non è pertanto stato raggiunto (target previsto € 333.333,00, target raggiunto € 290.000,00).

Indicatori di risultato: per quanto riguarda l'incremento del numero di turisti nell'area interessata dagli interventi, la valutazione di tale indicatore non è al momento verificabile non essendo ancora stato concluso il progetto.

MISURA 313 - AZIONE 4: Informazione

Obiettivo: In relazione all'obiettivo specifico del PSR per il Veneto 2007-2013 "3.2. Incentivare le attività e i servizi turistici nelle aree rurali", l'azione ha l'obiettivo operativo di promuovere attività informative, promozionali e pubblicitarie coordinate ed integrate a livello di area per accrescerne la conoscenza.

Beneficiari: Enti locali, associazioni agrituristiche, consorzi di promozione turistica, associazioni pubblico private.

Formula attuativa:	a regia
Pubblicazione:	8 aprile 2011
Chiusura lavori:	8 aprile 2014
Durata max interventi:	24 mesi
Importo totale messo a bando:	€ 80.000,00
Numero Interventi finanziati:	1 - investimento attivato € 150.000,00 (contributo € 67.380,04)
Formula attuativa:	a regia
Pubblicazione:	5 aprile 2012
Chiusura lavori:	5 ottobre 2014
Durata max interventi:	18 mesi
Importo totale messo a bando:	€ 218.194,00
Numero Interventi finanziati:	1 - investimento attivato € 270.316,15 (contributo € 216.253,20)

ANALISI INTERVENTI FINANZIATI (313.4)


Tipologia intervento realizzato: la Misura 313.4 prevedeva la realizzazione di attività informative, promozionali e pubblicitarie, coordinate e integrate a livello di area, per incentivare e promuovere i servizi turistici nelle aree rurali.

In particolare l'Ente Parco Nazionale Dolomiti bellunesi attraverso l'azione 313.4 ha sviluppato diversi strumenti di comunicazione allo scopo di promuovere l'area del Parco attraverso supporti comunicativi istituzionali e promozionali (pieghevoli multilingue a scopo divulgativo). Il Consorzio BIM Piave attraverso la medesima azione a realizzato una nuova grafica per il portale turistico *infodolomiti*, migliorandone i contenuti, sviluppando ed implementando le app. Infine è stato realizzato un progetto pilota tecnico grafico multimediale e diffusi 5 video tematici della durata di 15 minuti tramite le televisioni locali.

Indicatori di output: Anche nel caso della Misura 313 Azione 4, come nella Misura 313.3, la scelta di finanziare 2 beneficiari anziché 3 come previsto dall'indicatore di programma, è stata determinata dalla volontà di garantire un approccio unitario a livello provinciale degli interventi. Il target finanziario raggiunto è del 70,47% (target previsto € 596.388,00, target raggiunto €420.316,50). Anche in questo caso, la determinazione, da parte della Regione del Veneto di una quota di contributo maggiore a partire dal 2013 per i soggetti pubblici, ha determinato il mancato raggiungimento del target finanziario in quanto a parità di contributi ammessi il valore totale degli investimenti attivati è diminuito. Uno dei due progetti finanziati è coerente e speculare alle progettualità attivate da parte del GAL Alto Bellunese nell'ambito delle medesima Misura proprio al fine di garantire la copertura provinciale dell'azione promozionale proposta.

Indicatori di risultato: per quanto riguarda l'incremento del numero di turisti nell'area interessata dagli interventi, la valutazione di tale indicatore non è al momento verificabile non essendo ancora trascorso un periodo di tempo sufficiente dalla conclusione dei progetti.

Mapa degli interventi: MISURA 313

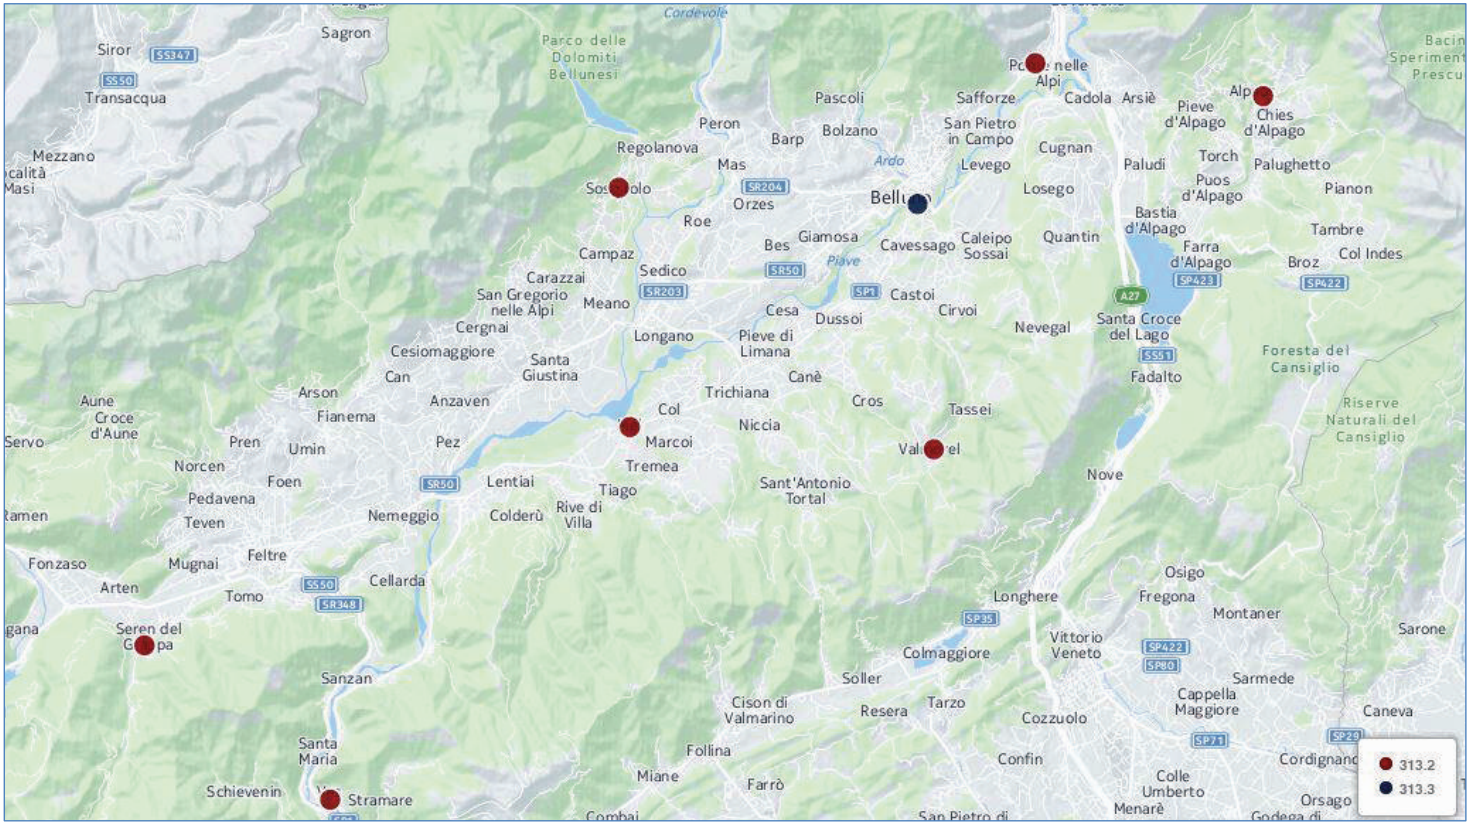

Localizzazione interventi finanziati attraverso la Misura 313 (mapa completa www.gal2.it)

3.7. MISURA 321

MISURA 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Approccio generale: come previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, nelle aree rurali, soprattutto di montagna, si registra un indebolimento della struttura dei servizi che accentua la fragilità del sistema sociale determinata dal progressivo abbandono e all'invecchiamento della popolazione. Il sostegno all'avviamento di alcuni servizi essenziali attivati da parte degli enti preposti, unitamente al miglioramento delle possibilità di accesso e della diffusione delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione, superando il digital divide esistente, viene considerato fondamentale per contribuire a contrastare queste dinamiche e ridare slancio e vitalità alle realtà rurali, ai fini del complessivo miglioramento della qualità della vita di queste aree.

I principali obiettivi della misura sono stati quelli di: a. migliorare le condizioni di vita nelle zone rurali; b. favorire l'ampliamento della gamma dei servizi disponibili e facilitarne l'accesso; c. promuovere percorsi e strategie innovative nella fornitura di servizi; f. facilitare l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro; e. diversificare le fonti energetiche; e. estendere le infrastrutture per Internet a banda larga nelle zone rurali.

La Misura 321 poteva essere attuata nei territori ubicati nelle aree rurali B, C e D (con una prevalenza ai territori ubicati nelle aree C e D), esclusivamente nei Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, nonché in quelli con densità abitativa inferiore a 150 abitanti per Km², attraverso i Piani di Sviluppo Locale ai sensi dell'asse IV.

Approccio locale, le azioni del GAL Prealpi e Dolomiti: nell'area del GAL Prealpi e Dolomiti, in particolare sono state quindi attivate due delle quattro Azioni previste, ovvero l'Azione 1 che aveva come obiettivo quello di stimolare le iniziative locali mirate allo sviluppo di servizi sociali e l'Azione 3 che mirava invece ad incentivare la diffusione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da biomasse e la eventuale fornitura di energia elettrica e/o termica alla popolazione.

MISURA 321 – Azione 1: Servizi Sociali

Obiettivo: In relazione all'obiettivo specifico del PSR per il Veneto 2007-2013 "3.6 Migliorare l'offerta e l'accesso ai servizi nelle aree rurali", l'azione persegue l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali, mediante il consolidamento e lo sviluppo della rete dei servizi essenziali, in particolare nelle aree più marginali.

Beneficiari: Enti locali e ASL

Formula attuativa:	a bando
Approvato con deliberazione Consiglio Direttivo GAL:	n. 42 del 14.12.2010
Pubblicazione bando:	pubblicato il 26 agosto 2011
Chiusura lavori:	entro il 26 agosto 2014
Durata max interventi:	36 mesi
Importo totale messo a bando:	€ 200.000,00
Numero Progetti finanziati:	2 - investimento attivato € 256.825,40 (contributo € 200.000,00)

ANALISI INTERVENTI FINANZIATI (321.1)

Tipologia intervento realizzato: nell'ambito della Misura 321.1 entrambe le strutture sanitarie locali presenti nell'area del GAL Prealpi e Dolomiti, hanno realizzato un Programma triennale 2011-2013 teso alla cura protezione e tutela del minore in condizioni di disagio.

In particolare l'ASL n°1 ha realizzato interventi a sostegno educativo domiciliare, servizi di protezione attraverso inserimento in strutture individuate secondo criteri di appropriatezza ai bisogni, progetti di collaborazione con cooperative sociali per il rafforzamento delle competenze educative dei genitori. L'ASL n°2 ha attivato azioni di promozione del benessere del bambino e di sensibilizzazione della popolazione sulla cultura della prima infanzia, attraverso azioni specifiche quali: laboratori scuola infanzia e primarie; interventi a domicilio per minori multiproblematici; progetti di solidarietà intercomunale. In base alla relazione finale redatta dai soggetti beneficiari, a seguito dell'intervento finanziato è stato possibile registrare un aumento degli interventi educativi a domicilio, una riduzione nel numero di inserimenti di minori nella struttura sanitaria ed il reinserimento in famiglia dei minori coinvolti nel progetto al 100%.

Indicatori di output: la scelta di finanziare un numero ridotto di beneficiari rispetto al target previsto (2 su 4) è stata determinata dalla necessità di concentrare le risorse a favore delle due ASL presenti sul territorio del GAL Prealpi e Dolomiti ed in grado di attivare servizi a favore dei minori su tutto il territorio di competenza del GAL con un approccio unitario. Il target finanziario raggiunto in termini di volume totale degli investimenti è stato di € 256.825,40 rispetto a € 285.714,00 previsti.

Indicatori di risultato: l'indicatore di risultato richiedeva di valutare il numero di utenti dei servizi migliorati. E' possibile considerare che gli interventi svolti hanno avuto come risultato quello di contribuire alla riduzione del numero di inserimenti in strutture sanitarie e il reinserimento in famiglia dei minori al 100%. Si è registrato inoltre un aumento degli interventi educativi a domicilio. Il target previsto di 40 utenti beneficiari dei servizi migliorati è stato raggiunto.

MISURA 321 - Azione: 3. Realizzazione di impianti per la produzione dell'energia da biomasse	
Obiettivo: In relazione all'obiettivo specifico del PSR per il Veneto 2007-2013 "3.4 Promuovere produzione ed utilizzo di energia da fonte rinnovabile di produzione locale" l'azione mira al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali, attraverso la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche e la cessione alla popolazione di energia da biomasse di origine agricola o forestale.	
Beneficiari: Enti pubblici e loro Consorzi	
Formula attuativa: Approvato con deliberazione Consiglio Direttivo GAL: Pubblicazione bando: Chiusura lavori: Durata max interventi: Importo totale messo a bando:	a bando n. 34 del 14/12/2011 pubblicato il 28/09/2012 entro il 12/04/2014 18 mesi € 400.000,00
Numero Progetti finanziati:	1 - investimento attivato € 193.779,76 (contributo € 115.816,20)

ANALISI INTERVENTI FINANZIATI (321.3)

Tipologia intervento realizzato: nell'ambito della Misura 321.3, è stato finanziato un intervento per l'installazione di un centrale termica alimentata a biomasse legnose a sostituzione dell'impianto presso un Comune.

Indicatori di output: il numero di beneficiari e di impianti realizzati è quindi di uno rispetto ad un target di 4. Il mancato raggiungimento del target è in parte dovuto al fatto che anche attraverso i fondi FESR era possibile ottenere finanziamenti atti a coprire costi relativi all'installazione di centrali a biomasse con una percentuale di cofinanziamento più elevata. Di conseguenza anche il target finanziario non è stato raggiunto (volume totale degli investimenti € € 193.779,76 rispetto a € 800.000,00 previsti). La potenza dell'impianto realizzato è di 300 kW (target 4 mW).

Indicatori di risultato: i dati necessari a quantificare il raggiungimento del target previsto (valutazione dell'incremento del valore aggiunto lordo di origine non agricola /numero di posti di lavoro creati) dovranno essere necessariamente raccolti attraverso un confronto con il beneficiario.

3.8. MISURA 323

MISURA 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Approccio generale: la Misura 323 ha avuto l'obiettivo di contribuire alla crescita dell'attrattività dei territori e delle aree rurali per mantenere la popolazione attiva in loco ed invertire così la tendenza al declino socio economico. Essa prevedeva due Sotto misure: Sottomisura A - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale; Sottomisura B - Formazione piani di gestione siti Natura 2000. La Misura poteva essere attivata esclusivamente in ambito Leader (da parte dei GAL) oppure nell'ambito di Progetti Integrati di Area Rurali (PIA-R).

La dotazione finanziaria della misura a livello regionale è aumentata nell'ultima fase di programmazione (2012) rispetto allo stanziamento iniziale di circa il 16% in ragione della elevata richiesta di interventi da parte dei GAL ed una conseguente necessità di finanziare un numero maggiore di beneficiari. A livello regionale quindi l'aspettativa di risultato in termini numero di interventi finanziati è passata da 296 a 553.

In base ai dati ufficiali relativi al PSR Veneto 2007-2013 riportati dalla Regione del Veneto nel portale Piave gli interventi finanziati nell'ambito della Misura 323 risultano i più numerosi rispetto al numero complessivo delle Misure attivate con un numero complessivo di 602 domande finanziate pari ad un valore complessivo di contributo concesso di € 34.919.000,00.

Approccio locale, le azioni del GAL Prealpi e Dolomiti: in tale contesto il GAL Prealpi e Dolomiti ha attivato la Sottomisura 323 A - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, attraverso le quattro azioni previste di cui si compone. Le domande finanziate da parte del GAL Prealpi e Dolomiti risultano pari al 13% del totale (79 domande) per un valore complessivo di contributo concesso pari ad € 3.020.992,25.

MISURA 323/a AZIONE 1: Realizzazione di studi e censimenti

Obiettivo: In relazione all'obiettivo specifico del PSR per il Veneto 2007-2013 "3.7 Migliorare, conservare e valorizzare il patrimonio rurale" l'azione persegue l'obiettivo di valorizzare le risorse storiche, culturali e paesaggistiche locali, per migliorare la qualità della vita dei residenti. Attuazione di studi propedeutici sul patrimonio storico-architettonico dell'area.

Beneficiari: Enti locali, GAL Prealpi e Dolomiti, Enti parco, Fondazioni, Onlus.

Formula attuativa:	a regia
Pubblicazione:	5 novembre 2010
Chiusura lavori:	5 novembre 2011
Durata max interventi:	12 mesi
Importo totale messo a bando:	€ 40.000,00
Numero Interventi finanziati:	1 - investimento attivato € 40.071,43 (contributo € 28.050,00)
Formula attuativa:	a regia
Pubblicazione:	31 dicembre 2010
Chiusura lavori:	31 dicembre 2011
Durata max interventi:	12 mesi
Importo totale messo a bando:	€ 42.000,00
Numero Interventi finanziati:	1 - investimento attivato € 34.560,87 (contributo € 24.192,60)
Formula attuativa:	a regia
Pubblicazione:	25 febbraio 2011
Chiusura lavori:	25 febbraio 2012
Durata max interventi:	12 mesi
Importo totale messo a bando:	€ 10.000,00
Numero Interventi finanziati:	1 - investimento attivato € 14.040,00 (contributo € 9.828,00)

ANALISI INTERVENTI FINANZIATI (323.1)

Tipologia intervento realizzato: Il GAL Prealpi e Dolomiti, la Provincia di Belluno e la Comunità Montana Feltrina, hanno svolto tre studi propedeutici agli interventi di recupero e riqualificazione previsti dalla Misura 323/a Azione 2/3. In particolare il GAL Prealpi e Dolomiti ha elaborato e prodotto un documento di studio e analisi del patrimonio territoriale suddiviso in 3 ambiti: Patrimonio storico/architettonico del territorio; Paesaggio rurale del territorio; Valorizzazione culturale dell'area rurale. La Provincia di Belluno ha svolto uno studio per la valorizzazione del patrimonio provinciale di architettura ed arte sacra: "I tesori dell'arte". Infine la Comunità Montana Feltrina ha prodotto uno studio dei manufatti e fabbricati legati all'antico uso dell'acqua nel territorio del GAL Prealpi e Dolomiti.

Indicatori di output: sono stati quindi finanziati 3 interventi (rispetto ad un target di 4) per un volume totale degli investimenti pari ad € 88.672,30 (rispetto a € 142.857,10 previsti).

Indicatori di risultato: l'indicatore relativo ai dati relativi alla popolazione rurale utente dei servizi migliorati potrebbe ritenersi coincidere con il numero di beneficiari finanziati tramite le Azioni 323.2, 323.3 e 323.4 in quanto gli studi prodotti sono stati propedeutici e funzionali all'identificazione degli interventi finanziabili. Il target raggiunto può essere quindi quantificato in un numero di 76 (nessun target numerico era stato identificato in relazione a questo indicatore).

MISURA 323/a AZIONE 2: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico	
Obiettivo: In relazione all'obiettivo specifico del PSR per il Veneto 2007-2013 "3.7 Migliorare, conservare e valorizzare il patrimonio rurale" l'azione intende incentivare interventi di conservazione e riqualificazione del patrimonio storico-architettonico dell'area.	
Beneficiari: Imprenditori agricoli, altri soggetti privati, enti pubblici, onlus, regole	
Formula attuativa: Approvato con deliberazione Consiglio Direttivo GAL: Pubblicazione: Chiusura lavori: Durata max interventi: Importo totale messo a bando:	a bando n. 28 del 08.11.2011 21 settembre 2011 21 marzo 2014 18 mesi € 1.050.271,45
Numero Interventi finanziati:	32 - investimento attivato € 2.106.049,62 (contributo € 980.066,52)
Formula attuativa: Approvato con deliberazione Consiglio Direttivo GAL: Pubblicazione: Chiusura lavori: Durata max interventi: Importo totale messo a bando:	a bando n. 13 del 27/06/2013 20 dicembre 2013 31 dicembre 2014 (prorogato) 12 mesi € 597.034,98
Numero Interventi finanziati:	20 - investimento attivato € 1.117.269,54 (contributo € 583.460,04)
Formula attuativa: Pubblicazione: Chiusura lavori: Durata max interventi: Importo totale messo a bando:	a regia 30 dicembre 2013 31 marzo 2015 18 mesi € 47.697,33
Numero Interventi finanziati:	1 - investimento attivato € 47.036,78 (contributo € 47.036,78)

ANALISI INTERVENTI FINANZIATI (323.2)

Tipologia intervento realizzato: La Misura 323 Azione 2 ha permesso di finanziare interventi volti ad incentivare il recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico ed edilizio di pregio, nel rispetto delle tipologie originarie, di quelle conoscenze e di quegli accorgimenti specifici con i quali si è costruito in passato e che sono stati tramandati per secoli fino ai giorni nostri. In particolare sono stati finanziati, attraverso tale Azione, 53 interventi. Dei 32 interventi finanziati attraverso il primo bando, ed attualmente conclusi, 18 hanno riguardato edifici siti nell'ambito di borghi storici e centri urbani, 14 edifici di pregio situati nelle frazioni limitrofe al comune di appartenenza. Di tali interventi 26 hanno riguardato beneficiari privati e 6 beneficiari pubblici.

Indicatori di output: gli indicatori di output sono stati ampiamente superati con un numero di interventi finanziati di 53 rispetto ad un target di 10, ed un volume totale degli investimenti pari ad € 3.270.355,94 rispetto ad €2.000.000,00 previsti.

Indicatori di risultato: per quanto riguarda l'incremento del numero di turisti nell'area interessata dagli interventi, la valutazione di tale indicatore non è al momento verificabile in quanto tale indicatore richiede un confronto con dati statistici e dati rilevati dai beneficiari sul territorio al momento non reperibili.

MISURA 323/a AZIONE 3: Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale	
Obiettivo: In relazione all'obiettivo specifico del PSR per il Veneto 2007-2013 "3.7 Migliorare, conservare e valorizzare il patrimonio rurale" l'azione persegue l'obiettivo di valorizzare le risorse paesaggistiche locali attraverso l'incentivazione delle azioni di conservazione e riqualificazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio nell'area.	
Beneficiari: Imprenditori agricoli, altri soggetti privati, enti pubblici, onlus, regole	
Formula attuativa:	a bando
Approvato con deliberazione Consiglio Direttivo GAL:	n. 22 del 27.09.2011
Pubblicazione:	8 agosto 2012
Chiusura lavori:	24 agosto 2014 (prorogato)
Durata max interventi:	24 mesi
Importo totale messo a bando:	€ 600.000,00
Numero Interventi finanziati:	9 - investimento attivato € 625.482,70 (contributo € 452.536,82)
Formula attuativa:	a regia
Pubblicazione:	20 novembre 2013
Chiusura lavori:	31 dicembre 2014
Durata max interventi:	12 mesi
Importo totale messo a bando:	€ 140.000,00
Numero Interventi finanziati:	2 - investimento attivato € 139.872,03 (contributo € 139.872,03)

ANALISI INTERVENTI FINANZIATI (323.3)

Tipologia intervento realizzato: nell'ambito dell'Azione 323/3 sono stati finanziati 9 interventi a bando e 2 a regia. Degli 11 interventi 10 hanno riguardato beneficiari pubblici ed 1 beneficiari privati. Coerentemente con gli studi propedeutici effettuati attraverso la Misura 323 Azione 1 tutti gli interventi riguardano siti di pregio e valenza culturale o paesaggistica. 9 degli 11 interventi effettuati sono stati realizzati all'interno di centri storici come definiti dall'Atlante dei Centri Storici della Regione del

Veneto. 6 di questi sono ubicati nei pressi di attività commerciali/artigianali. Infine 6 su 11 sono stati realizzati lungo il percorso 'Cammino delle Dolomiti'. La valenza pubblica degli interventi è particolarmente evidente nell'ambito di questa misura poiché il recupero dei manufatti storici e di edifici di pregio ha permesso la valorizzazione di spazi pubblici adibiti ad aree di sosta e di ritrovo per la cittadinanza (piazze comunali, aree adiacenti ad edifici di pregio e situate nei centri storici).

Indicatori di output: gli indicatori di output sono stati superati con un numero di interventi finanziati di 11 rispetto ad un target di 6. Il mancato raggiungimento del target finanziario previsto (volume totale degli investimenti attivati è pari ad € 765.354,73 rispetto ad €1.000.000,00 previsti) è dovuto alla determinazione, da parte della Regione del Veneto di una quota di contributo maggiore a partire dal 2013 pari al 100% per gli enti pubblici che ha determinato il mancato raggiungimento del target finanziario in quanto a parità di contributi ammessi il valore totale degli investimenti attivati è diminuito.

Indicatori di risultato: per quanto riguarda l'incremento del numero di turisti nell'area interessata dagli interventi, la valutazione di tale indicatore non è al momento verificabile in quanto tale indicatore richiede un confronto con dati statistici e dati rilevati dai beneficiari sul territorio al momento non reperibili. Per quanto riguarda la fruibilità turistica, gli interventi finanziati si collocano tutti nell'ambito di una serie di percorsi riconosciuti, primo fra tutti il Cammino delle Dolomiti ma anche il percorso Alpego Natura o il sentiero Buzzati. Essi hanno tuttavia anche una valenza di interesse pubblico per i cittadini poiché rappresentano hanno contribuito alla riqualificazione urbana dei centri storici coinvolti.

MISURA 323/a AZIONE 4: Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali	
Obiettivo: In relazione all'obiettivo specifico del PSR per il Veneto 2007-2013 "3.7 Migliorare, conservare e valorizzare il patrimonio rurale" l'Azione si propone di valorizzare le risorse culturali locali mediante la creazione e la promozione di itinerari e circuiti culturali.	
Beneficiari: Enti pubblici	
Formula attuativa:	a regia
Pubblicazione:	6 luglio 2012
Chiusura lavori:	6 luglio 2014 prorogato
Durata max interventi:	24 mesi
Numero Interventi finanziati:	8 - € 675257,02 (contributo concesso € 417.920,82)
Formula attuativa:	a regia
Pubblicazione:	26 ottobre 2012
Chiusura lavori:	26 aprile 2014
Durata max interventi:	18 mesi
Numero Interventi finanziati:	1 - € 78,441,33 (contributo € 58,831,00)
Formula attuativa:	a regia
Pubblicazione:	22 novembre 2013
Chiusura lavori:	31 dicembre 2014 prorogato
Durata max interventi:	12 mesi
Numero Interventi finanziati:	1 - € 98.278,00 (contributo € 98.278,00)
Formula attuativa:	a regia
Pubblicazione:	6 dicembre 2013
Chiusura lavori:	31 dicembre 2014 prorogato
Durata max interventi:	12 mesi
Numero Interventi finanziati:	2 - € 180.000,00 (contributo € 180.000,00)


ANALISI INTERVENTI FINANZIATI (323.4)

Tipologia intervento realizzato: l'identificazione dei siti ammissibili al finanziamento in relazione all'Azione 4 della Misura 323 è stata effettuata in coerenza e nel rispetto degli studi effettuati nell'ambito della Azione 1 (della medesima Misura 323) Realizzazione di studi e censimenti. In particolare il c.d. patrimonio rurale assume in base agli studi condotti dallo stesso GAL Prealpi e Dolomiti una triplice connotazione: Patrimonio storico/architettonico del territorio; Paesaggio rurale del territorio; Valorizzazione culturale dell'area rurale. Per quanto riguarda in particolare questo ultimo punto, la ricerca ha identificato alcune categorie di siti considerati rilevanti dal punto di vista culturale sia per il valore intrinseco dell'edificio che per la funzione pubblica che svolgono nell'ospitare eventi, mostre e iniziative di particolare interesse per la popolazione. Ecco che quindi rientrano in tale categoria oltre agli archivi, musei, siti archeologici, anche i centri polifunzionali, le biblioteche e i centri didattico-ricettivi. Tutti i 12 interventi finanziati nell'ambito della Misura 323.4 rientrano in tale categoria e sono elencati all'interno del documento redatto dal GAL e relativo alla Valorizzazione culturale dell'area rurale. In particolare sono stati finanziati interventi riguardanti: 5 centri culturali / polifunzionali; 5 edifici museali; 2 siti di interesse storico/architettonico.

Indicatori di output: il target relativo al numero di interventi sovvenzionati è stato raggiunto (target previsto 7, target raggiunto 12) mentre quello relativo al volume totale degli investimenti mobilitati non è stato raggiunto in quanto il contributo concesso nell'ambito degli ultimi progetti approvati al 2013 è stato pari al 100% del finanziamento totale (target previsto € 1.400.000,00, target raggiunto € 955.319,10).

Indicatori di risultato: per quanto riguarda l'incremento del numero di turisti nell'area interessata dagli interventi, la valutazione di tale indicatore non è al momento verificabile in quanto tale indicatore richiede un confronto con dati statistici e dati rilevati dai beneficiari sul territorio al momento non reperibili.

Mappa degli interventi: MISURA 323

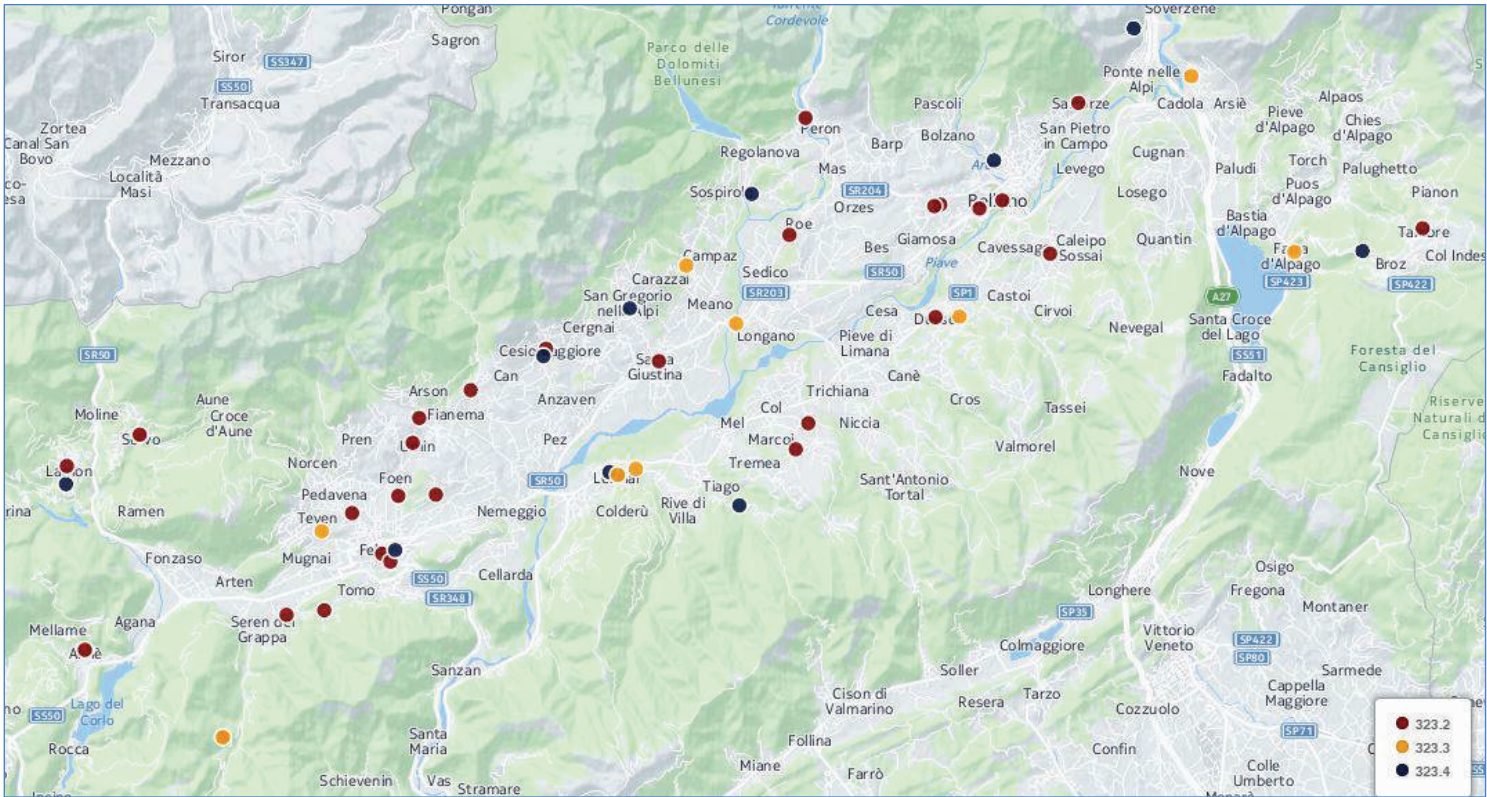

Localizzazione interventi finanziati attraverso la Misura 323.2, 323.3, 323.4 (mappa completa www.gal2.it)

4. CONCLUSIONI

4.1 Analisi degli indicatori proposti

In base all'analisi degli *indicatori di output e risultato* analizzati è possibile fare le seguenti considerazioni.

Gli *indicatori di output* (o di prodotto) - come indicato nel Quadro Comune Europeo per il Monitoraggio e la Valutazione (QCMV) - si misurano sempre in termini quantitativi, e cioè come unità fisiche e finanziarie che misurano le attività direttamente realizzate attraverso i programmi. Nell'analisi condotta gli indicatori di output (Tabella n.16 in allegato) sono stati monitorati attraverso un'analisi puntuale degli interventi realizzati. Nel documento sono contenute informazioni dettagliate su target raggiunti per Misura ed Azione. A conclusione del documento si propone una riflessione sugli aspetti più rilevanti per quanto riguarda l'analisi complessiva di questi indicatori.

Gli *indicatori di risultato* sono spesso verificabili passato un determinato lasso di tempo dalla conclusione degli interventi, posso essere descritti con valore di quantitativo (es. numero di posti lavoro creati) ma in alcuni casi sono previsti anche dati qualitativi. Nell'analisi degli indicatori di risultato previsti dal PSL PREDIRE (Tabella n.15 in allegato) è stato solo in parte possibile restituire valori attendibili in relazione ai target richiesti a causa di alcuni elementi oggettivi che rendono di fatto limitata la possibilità di verificarne i dati. In particolare:

- mentre alcuni degli indicatori previsti puntano a misurare gli effetti diretti ed immediati dell'intervento (es. numero di posti di lavoro creati), altri si riferiscono al raggiungimento di obiettivi più a lungo termine che dipendono non solo direttamente dall'intervento svolto ma anche da fattori esterni legati più in generale al programma di sviluppo (es. incremento del numero di turisti).
- il monitoraggio degli indicatori di risultato deve avvenire necessariamente in seguito alla chiusura degli interventi ed in alcuni casi richiede che sia passato un determinato lasso di tempo per la sua valutazione (es. incremento del valore aggiunto lordo di origine non agricola).
- i dati necessari a quantificare il raggiungimento del target previsto devono essere in molti casi raccolti attraverso un confronto con i beneficiari degli interventi attraverso questionari, indagini a campione, verifiche in loco.

4.2 Raggiungimento complessivo degli obiettivi target in base agli indicatori dati e valutazioni conclusive

In riferimento agli indicatori complessivi di output (vedi Tabella n.15 in allegato).

Essi erano sostanzialmente composti da indicatori riferiti al numero di beneficiari raggiunti/interventi finanziati, ed il valore in termini finanziari degli investimenti attivati grazie al contributo concesso. Per quanto riguarda il primo di questi due indicatori generali, numero di beneficiari raggiunti/interventi finanziati, attraverso gli interventi finanziati a bando è stato raggiunto un numero di beneficiari superiore al target previsto, sono stati infatti assegnati, in seguito alle revisioni di allocazione di budget tra misure ed all'overbooking ottenuto, ulteriori contributi nell'ambito in particolare delle Misure 121 e 323.2. Per quanto riguarda gli interventi a regia, essi sono stati attuati tenendo conto della necessità di realizzare interventi strategici sovra territoriali e quindi in alcuni casi l'indicatore numerico relativo al numero di interventi sovvenzionati non è stato raggiunto. Tuttavia, nel caso degli interventi a regia la capacità del soggetto beneficiario di attuare interventi sull'intero territorio del GAL è stata considerata prioritaria rispetto alla necessità di finanziare una pluralità di beneficiari.

L'indicatore finanziario relativo al volume totale di investimenti mobilitati, si è dimostrato soddisfacente anche se non ha raggiunto del tutto il target previsto (totale percentuale su target previsto del 97%). Per quanto riguarda il settore privato le rinunce intervenute da parte dei soggetti ammessi al contributo, se pur in numero limitato, hanno determinato il mancato raggiungimento del target finanziario previsto. Le difficoltà e problematiche riscontrate possono in parte individuarsi nella concomitante attuazione, parte della Regione, delle medesime Misure con una percentuale di finanziamento maggiore o condizioni più vantaggiose. Nel caso dei beneficiari pubblici il mancato raggiungimento del target finanziario è stato in parte determinato dalla concessione del contributo al 100% a partire dal 2013 per

alcune Azioni inizialmente finanziate con contributo inferiore. Infine il mancato aggiornamento degli indicatori di output in seguito alle revisioni di budget per Misura intervenute con le ultime variazioni, rende di fatto non coerente il valore di indicatore con il target di spesa previsto. Quindi sebbene il target finanziario sia di poco inferiore alla previsione, il valore complessivo raggiunto può ritenersi positivo e coerente con la strategia implementata e gli obiettivi attesi. Per quanto riguarda i target parziali raggiunti per Misura, si rileva che tale indicatore andrebbe aggiornato coerentemente alle variazioni di budget attuate nel corso dell'attuazione del PSL ed alle variazioni di percentuale di contributo.

In riferimento agli indicatori complessivi di risultato (vedi Tabella n.15 in allegato).

Nell'ambito del presente documento è stato possibile verificare il valore di alcuni indicatori di risultato proposti. L'analisi di tali valori permette di confermare il raggiungimento, ed il superamento in alcuni casi, dei target.

In particolare, per quanto riguarda la Misura 331, il numero di partecipanti che hanno completato con successo la formazione è stato ampiamente superato.

La superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio, indicatore previsto nell'ambito della Misura 227, è stato raggiunto (20 km).

Infine anche il numero popolazione utente dei servizi migliorati in relazione alla Misura 323.1 è stato superato.

Sono invece attualmente non verificabili alcuni degli indicatori proposti: l'incremento del valore aggiunto lordo di origine non agricola delle aziende beneficiarie - pur essendo un indicatore valido da monitorare per il settore privato e coerente anche con la necessità di comparare i risultati raggiunti in termini di crescita per i beneficiari rispetto al business plan richiesto in fase di richiesta di contributo alle imprese- non è attualmente verificabile poiché la raccolta dei dati necessita che sia trascorso un determinato periodo di tempo dalla conclusione degli interventi ed un confronto puntuali con i beneficiari.

Il numero lordo di posti di lavoro creati non è attualmente verificabile perché dovrà essere valutato in base ai dati forniti dai beneficiari con una verifica puntuale della stretta correlazione tra tale dato e l'intervento attuato.

Il numero di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti/nuove tecniche nell'ambito delle Misure 121 e 123 in quanto, mentre a livello regionale il dato era verificabile poiché ad esso era abbinato uno specifico punteggio in sede di valutazione, nell'ambito dell'Asse IV Leader tale punteggio non era previsto.

Risulta infine di difficile applicazione e misurazione l'indicatore relativo all'incremento del numero di turisti. In relazione alla Misura 323.2/323.3/323/4 gli interventi previsti, pur coerenti con i criteri previsti dal bando in termini di valenza storico architettonica e culturale non sempre avevano come obiettivo quello di accrescere la presenza turistica nella zona quanto piuttosto accrescerne la valenza pubblica e la fruizione da parte della cittadinanza.

Nel caso della Misura 313.1 e 313.2 invece la valutazione di tale indicatore richiede un intervento puntuale di monitoraggio flussi da parte dei beneficiari, che dovrebbe essere inserito in futuro come elemento integrante i requisiti di attuazione degli interventi. In questo caso infatti si tratta di un vero e proprio indicatore di impatto la cui valenza è inoltre condizionata da elementi esterni rispetto all'intervento quali attrattività generale dell'area, stagionalità dei flussi turistici, condizioni meteorologiche, molteplicità dell'offerta turistica, capacità in termini di promozione, etc.

Anche nel caso di interventi immateriale quali quelli previsti dall'azione 313.3 e 313.4 avrebbero dovuto prevedere già nel progetto delle modalità di monitoraggio di questo indicatore per poter dare un riscontro anche in termini temporali del flusso turistico mobilitato grazie agli interventi. In questo ultimo caso inoltre non essendo gli interventi terminati tale valutazione è comunque non attuabile.

INDICATORI E TARGET PREalpi e Dolomiti per l'Innovazione e il Rilancio dell'Economia PRE.D.I.R.E 2007-2013			
INDICATORI DI OUTPUT		TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
311;312;121;123	Imprese (microimprese) beneficiarie	31	64
Tutte le Misure	Volume totale investimenti	€ 15.016.863,00	€ 14.564.632,50
311.2	Posti letto realizzati	20	88
313.1	Itinerari finanziati	8	15
313.2	Strutture	5	8
313.3;313.4	Progetti finanziati	2	1
331.1	Operatori economici partecipanti ad attività sovvenzionate	80	367
331.1	Formazione/Informazione impartita (ore)	625	661
331.1	Interventi di formazione/informazione (numero)	8	4
321.1;321.3	Azioni sovvenzionate	8	3
321.3	Impianti energetici realizzati	4	1
321.3	Potenza degli impianti (Mw)	4 mw	300kw
323	Interventi sovvenzionati	28	79
227	Numero di proprietari di foreste beneficiari	3	4
INDICATORI DI RISULTATO		TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
311;312;121;123;321.3	Incremento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie	€ 450.000,00	N.D.
311;312;313;321.3	Numero lordo di posti di lavoro creati	23	N.D.
313323.2;323.3;323.4	Incremento del numero di turisti	71.000	N.D.
331.1	Partecipanti che hanno terminato con successo la formazione	50	238
121;123	Imprese che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche (tecnologie)	14	N.D.
321.1;323.1	Popolazione rurale utente dei servizi migliorati	40	76
227	Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio	20	20

Tabella n. 15 – Sintesi indicatori e target, PRE.D.I.R.E 2007-2013- elaborazione GAL Prealpi e Dolomiti

	311.1	311.2	312	313.1	313.2	313.3	313.4	331.1	121	123	321.1	321.3	323/A.1	323/A.2	323/A.3	323/A.4	227
INDICATORI DI OUTPUT																	
Imprese (microimprese) beneficiarie	X	X	x						x	x							
Volume total investimenti	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Posti letto realizzati		x															
Itinerari finanziati				x													
Strutture					x												
Progetti finanziati						x	x										
Operatori economici partecipanti ad attività sovvenzionate								x									
Formazione/Informazione impartita (ore)								x									
Interventi di formazione/informazione (numero)								x									
Azioni sovvenzionate											x	x					
Impianti energetici realizzati												x					
Potenza degli impianti (Mw)												x					
Interventi sovvenzionati													x	x	x	x	
Numero di proprietari di foreste beneficiari																	x
INDICATORI DI RISULTATO																	
Incremento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie	X	x	x						x	x		x					
Numero lordo di posti di lavoro creati	X	x	x	x	x	x	x					x					
Incremento del numero di turisti				x	x	x	x							x	x	x	
Partecipanti che hanno terminato con successo la formazione								x									
Imprese che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche (tecnologie)									x	x							
Popolazione rurale utente dei servizi migliorati											x		x				
Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio																	x

Tabella n. 16 – Matrice indicatori, PRE.D.I.R.E 2007-2013- elaborazione GAL Prealpi e Dolomiti

LEGENDA TABELLE

Tabella n. 1 – Percentuale impegno finanziario iniziale per linea strategica di intervento

Tabella n. 2 – Impegno finanziario iniziale assunto da parte del GAL Prealpi e Dolomiti nell'ambito della Misura 410

Tabella n. 3 – Impegno finanziario definitivo assunto da parte del GAL Prealpi e Dolomiti nell'ambito della Misura 410

Tabella n. 4 – Grafico relativo alla variazione dello stanziamento suddivisa per Asse

Tabella n. 5 – Percentuale impegno finanziario definitivo per linea strategica di intervento

Tabella n. 6 – Percentuale contributo assegnato per Asse di intervento rispetto al totale

Tabella n. 7 – Numero beneficiari pubblici e privati nell'ambito della Programmazione Leader del GAL Prealpi e Dolomiti

Tabella n. 8 – Spesa ammessa e contributo concesso per beneficiari pubblici e privati nell'ambito della Programmazione Leader del GAL Prealpi e Dolomiti

Tabella n. 9 - Grafico relativo alla proporzione tra contributo stanziato e contributo liquidato suddivisa per Misura

Tabella n. 10 – Tabella di raffronto sulla capacità di spesa dei GAL Veneti

Tabella n. 11 – Le categorie economiche dei beneficiari privati

Tabella n. 12 – Tipologie di intervento dei beneficiari pubblici

Tabella n. 13- Dati Valutazione Intermedia PSR Veneto 2007-2013 su Misura 121 e 123

Tabella n. 14 - Dati Valutazione Intermedia PSR Veneto 2007-2013 su Misura 311

Tabella n. 15 – Sintesi indicatori e target, PRE.D.I.R.E 2007-2013- elaborazione GAL Prealpi e Dolomiti

Tabella n. 16 –Matrice indicatori, PRE.D.I.R.E 2007-2013- elaborazione GAL Prealpi e Dolomiti
